

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-133-2016

EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA SIENDO LAS 16:00 HORAS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018, SE REUNEN EN LAS OFICINAS DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA UBICADAS EN LIRA Y ORTEGA N°42 COL. CENTRO TLAXCALA, TLAX. LAS PERSONAS CUYO NOMBRE Y CARÁCTER CON EL QUE INTERVIENEN Y SE MENCIONAN A CONTINUACIÓN:

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO EN SU CARÁCTER DE JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION Y EL ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ EN SU CARÁCTER DE RESIDENTE DE OBRA Y LA EMPRESA CONSTRUCTORA JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA HERNANDEZ REPRESENTADA POR JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA HERNANDEZ ENCARGADA DE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS CORRESPONDIENTES.

PARA REALIZAR CON FUNDAMENTO EN LOS ARTICULOS 64 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, Y LA CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS QUE SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

NUMERO DE CONTRATO: ITAT-29-133-2016

NUMERO DE CODIGO: PROG-EXP-01-2016

OBJETO DEL CONTRATO: INSTITUTO TECNOLÓGICO DEL ALTIPLANO DE
TLAXCALA, SAN DIEGO XOCOYUCAN,
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS

ANOTAR LA DESCRIPCION: EDIFICIO "Q" UNIDAD ACADEMICA
DEPARTAMENTAL TIPO 2, 11 EE. ESTRUCTURA
DE CONCRETO AISLADA Y OBRA EXTERIOR

MONTO ORIGINAL DE LA OBRA: \$ 15,324,337.92
(QUINCE MILLONES TRESCIENTOS
VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
SIETE PESOS 92/100 M.N.) IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 259 DIAS NATURALES

DIAS DE PRORROGA 84 DIAS NATURALES

FECHA DE INICIO SEGÚN CONTRATO: 31/10/2016

FECHA DE TERMINACION CONTRATO: 16/07/2017

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-133-2016

I. MODIFICACIONES.

FECHA DE INICIO REAL: 31/10/2016

FECHA DE TERMINACION REAL: 08/05/2018

MONTO REAL EJERCIDO: \$ 17,011,092.49
(DIECISIETE MILLONES ONCE MIL NOVENTA Y DOS PESOS 49/100 M.N.)
IVA INCLUIDO

III. RELACION DE ESTIMACIONES.

#REF!

PAGO	MONTO COBRADO CON I.V.A	FECHA DE ESTIMACION
MONTO CONTRATO	\$ 17,015,044.57	31/10/2016
ESTIMACION 1	\$ 437,253.06	25/12/2016
ESTIMACION 2	\$ 1,200,205.65	30/01/2017
ESTIMACION 3	\$ 549,917.07	17/02/2017
ESTIMACION 4	\$ 578,476.37	13/03/2017
ESTIMACION 5	\$ 296,925.86	31/03/2017
ESTIMACION 6	\$ 654,577.72	12/04/2017
ESTIMACION 7	\$ 437,337.19	21/04/2017
ESTIMACION 8	\$ 484,327.70	29/04/2017
ESTIMACION 9	\$ 431,552.17	15/05/2017
ESTIMACION 10	\$ 568,338.06	26/05/2017
ESTIMACION 11	\$ 681,506.38	02/06/2017
ESTIMACION 12	\$ 744,496.68	12/06/2017
ESTIMACION 13	\$ 201,926.39	17/06/2017
ESTIMACION 14	\$ 360,876.55	30/06/2017
ESTIMACION 15	\$ 436,144.65	07/07/2017
ESTIMACION 16	\$ 799,804.31	15/07/2017
ESTIMACION 17	\$ 491,895.94	22/07/2017
ESTIMACION 18	\$ 780,611.84	31/07/2017
ESTIMACION 19	\$ 620,667.85	08/08/2017
ESTIMACION 20	\$ 2,731,420.59	19/08/2017
ESTIMACION 21	\$ 1,831,082.78	14/09/2017
ESTIMACION 22	\$ 578,374.79	20/09/2017
ESTIMACION 23	\$ 564,945.96	30/09/2017
ESTIMACION 24 (FINIQUITO)	\$ 548,426.93	08/05/2018
	\$ 17,011,092.49	

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE EL CONTRATISTA NO PRESENTA SALDO A FAVOR NI EN CONTRA.

COMO RESULTADO DEL FINIQUITO EFECTUADO SE DETERMINA QUE NO EXISTE: SALDOS A FAVOR, NI SALDOS EN CONTRA DEL CONTRATISTA

al

[Signature]

I. GARANTIA DE DEFECTOS, VICIOS OCULTOS Y CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD.

DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 66 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, SE LE SOLICITA REALIZAR EL TRAMITE CORRESPONDIENTE Y PRESENTAR LA **FIANZA DE VICIOS OCULTOS** QUE GARANTICE LOS TRABAJOS EJECUTADOS, POR EL MONTO INDICADO EN EL FINIQUITO DE OBRA PRESENTADO., PARA RESPONDER DE LOS DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA MALA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD EN QUE SE HUBIERA INCURRIDO EN SU EJECUCIÓN

LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DE ESTA FIANZA SE EXTINGUIRAN AUTOMATICAMENTE UNA VEZ TRANSCURRIDO EL PLAZO PARA HACERLA EXIGIBLE, SIEMPRE Y CUANDO EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA NO HUBIERA PRESENTADO ANTE LA INSTITUCIÓN AFIANZADORA RECLAMACION DE PAGO.

CON LO ANTERIOR, SE DA POR TERMINADA ESTA DILIGENCIA SIENDO LAS 16:30 HORAS DEL DIA 10 DE MAYO DE 2018 EN LA CIUDAD DE TLAXCALA, TLAXCALA. LEVANTANDOSE LA PRESENTE ACTA, FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON

ACTA FINIQUITO DE CONTRATO N° ITAT-29-133-2016

POR EL ITIFE

POR LA EMPRESA CONSTRUCTORA




ING. JOSE LUIS FRAGOSO RODRIGUEZ

SUPERVISOR ITIFE



JOSE CLAUDIO MANUEL RUGARCIA
HERNANDEZ

Vo.Bo.

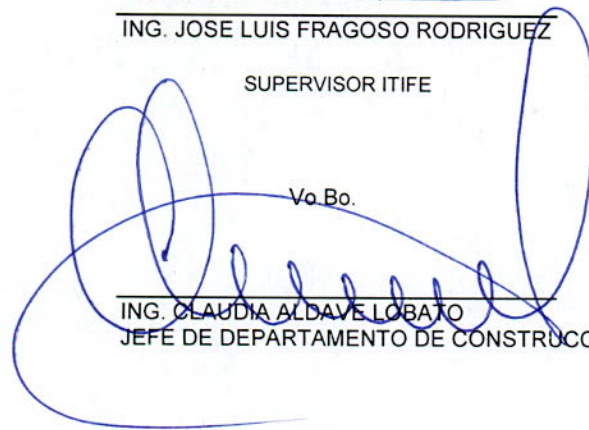

ING. CLAUDIA ALDAVE LOBATO
JEFE DE DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCION

OPERADO
