



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Clave: FT-DA-06-00

Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/0804/2023.

Tlaxcala, Tlax., 29 de Junio de 2023.

Asunto: Indicadores 2do Trimestre 2023

ARQUITECTO GIMENA LARA PÉREZ
COORDINADORA GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN
P R E S E N T E

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez anexo al presente, reporte de resultados de indicadores correspondiente al **Segundo Trimestre** del ejercicio 2023 del FAM Básico 2023, en formato Excel, señalando que en el trimestre no se tiene ningún proyecto en proceso.

Así mismo le informo que en el Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaría de Planeación y Finanzas (SIIF), se reportan los avances en indicadores 369, 365, 362, 359, 356, 354, 351, 350, 343, 341, 339, 320, 355, 349.

Sin otro particular envió un cordial saludo.

ATENTAMENTE



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

LICENCIADO MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

C.c.p. Archivo

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA****AVANCE DE INDICADORES****AL 28 DE JUNIO DE 2023****Clasificación Pp:** E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**Entidad:** INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**U. Responsable:** DIRECCIÓN GENERAL**Proyecto:** 5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACION CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO 2DO TRIMESTRE	ALCANZADO	ACUMULADO ANUAL	OBSERVACIONES
F	F	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16810	0	0	0	NO SE ESTABLECE META EN EL PERIODO
P	P	NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	PLANTEL	109	0	0	0	NO SE ESTABLECE META EN EL PERIODO
C O M P O N E N T E	1	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	30	5	0	0	NO SE ALCANZA LA META AL NIVEL COMPONENTE
	2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	46	8	0	0	NO SE ALCANZA LA META AL NIVEL COMPONENTE
	3	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	33	6	0	0	NO SE ALCANZA LA META AL NIVEL COMPONENTE
	4	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16810	841	841	841	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	1.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	VISITA	30	12	12	18	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	1.2	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	30	6	6	6	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	1.3	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	30	4	4	4	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA****AVANCE DE INDICADORES****AL 28 DE JUNIO DE 2023****TLXCALA**
UNA NUEVA HISTORIAClasificación Pp: **E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**Entidad: **INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**U. Responsable: **DIRECCIÓN GENERAL**Proyecto: **5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACION CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES BASICO 2023**

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO 2DO TRIMESTRE	ALCANZADO	ACUMULADO ANUAL	OBSERVACIONES
A C T I V I D A D	2.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VISITA	46	18	12	24	SE CUMPLE LA META EN UN 67% DEL TOTAL PROGRAMADO
	2.2	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	46	15	13	13	SE CUMPLE LA META EN UN 87% DEL TOTAL PROGRAMADO
	2.3	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	46	9	9	9	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	3.1	CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	6	1	1	1	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	3.2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA	PROYECTO	33	3	2	2	SE CUMPLE LA META EN UN 67% DEL TOTAL PROGRAMADO
	4.1	HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	HOMBRE	8573	250	250	429	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	4.2	ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	MUJER	8237	297	297	412	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO

ELABORÓ:

C.P. Jaqueline Cuaxilo Ortega
Programador Contable del ITIFE

ITIFE
 8237 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN**
C.P. Jaime Hernández Hernández
Jefe de Departamento de Administración
del ITIFE**ITIFE**AUTORIZO:
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**DIRECCIÓN GENERAL**C.P. Miguel Piedras
Director del ITIFE

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 598. PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 369. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MEP	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA	2.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRMM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	16.51
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

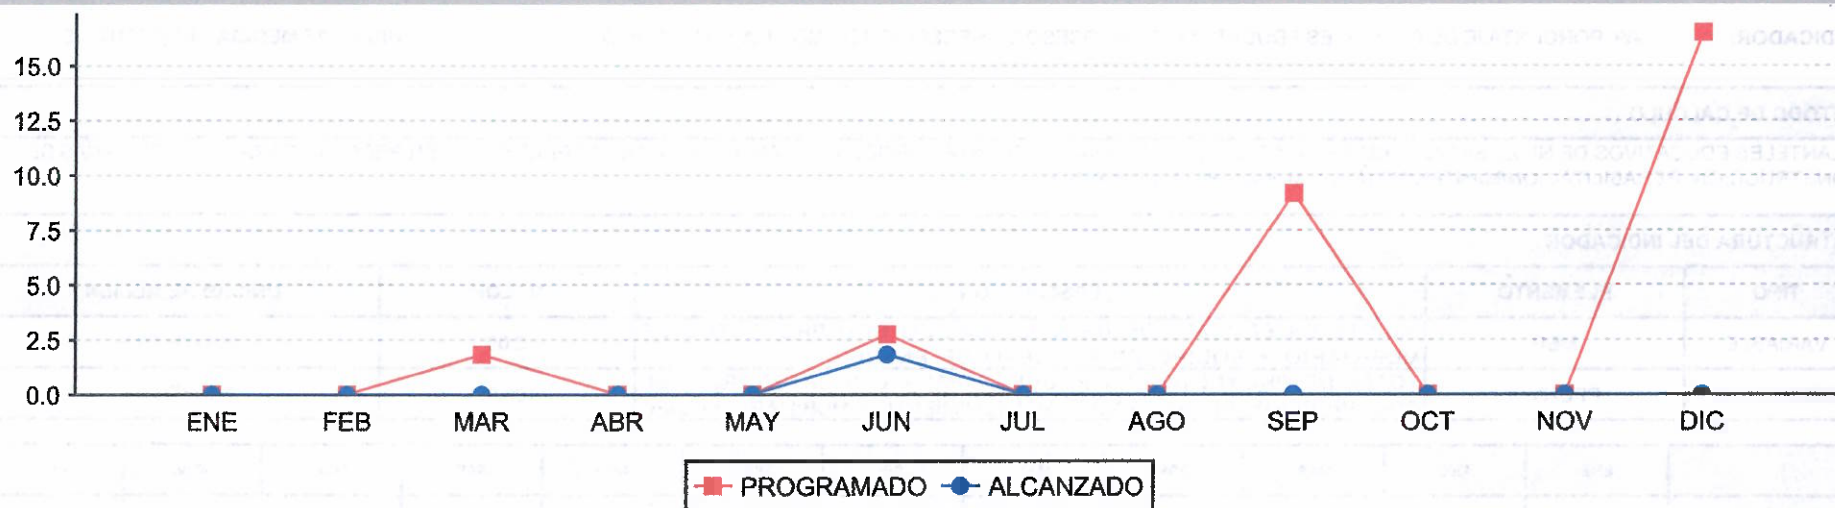


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO

C.P. ADMINISTRACIÓN

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 598-PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 369-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO <http://tife.gob.mx/contratos%20mobiliario%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAVIER FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 597. CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 365. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CMEC	CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO	1.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCRMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	3.66
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

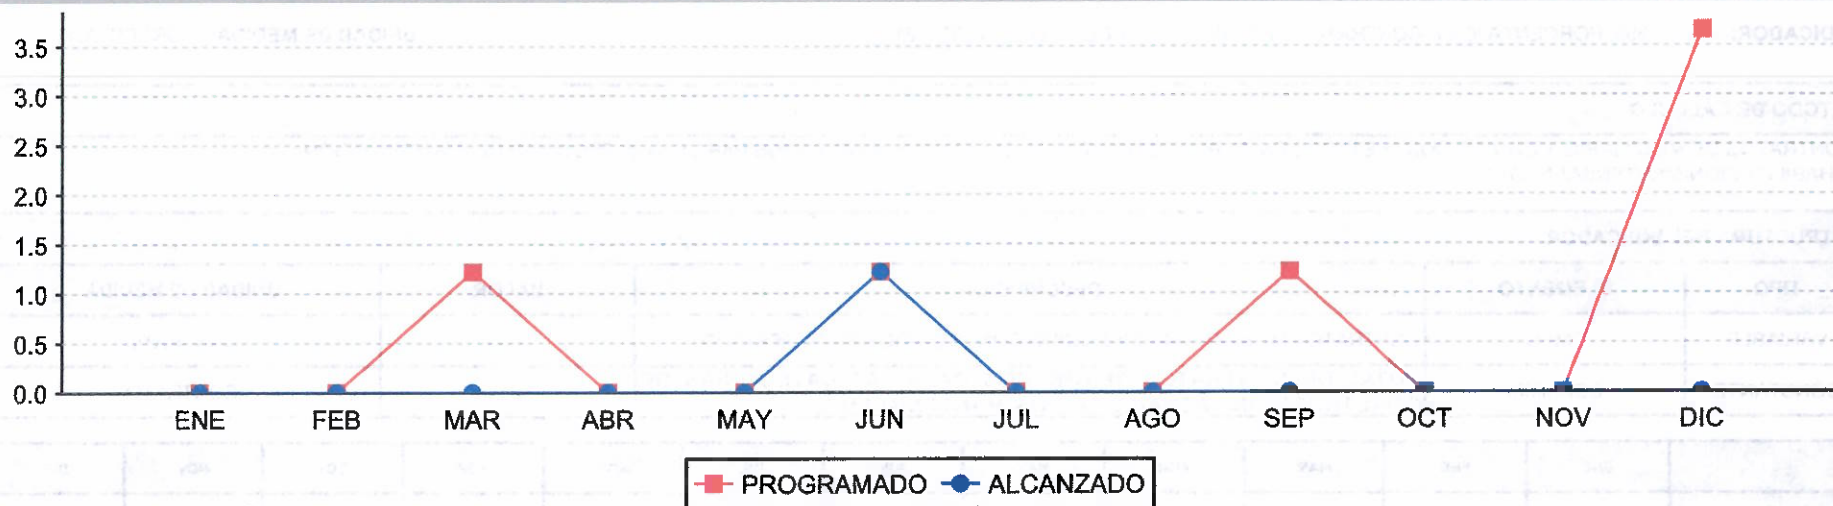

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
ADMINISTRACIÓN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZÓ
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 597-CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 365-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE MOBILIARIO / EQUIPO Y REQUISICIONES <http://itife.gob.mx/requisiciones%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
ELABORA
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
AUTORIZO
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 596. REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 362. PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ORMP	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO	9.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRMM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	13.76
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(Faint background stamps and text from the official document, including 'DIRECCIÓN GENERAL' and 'INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA')

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

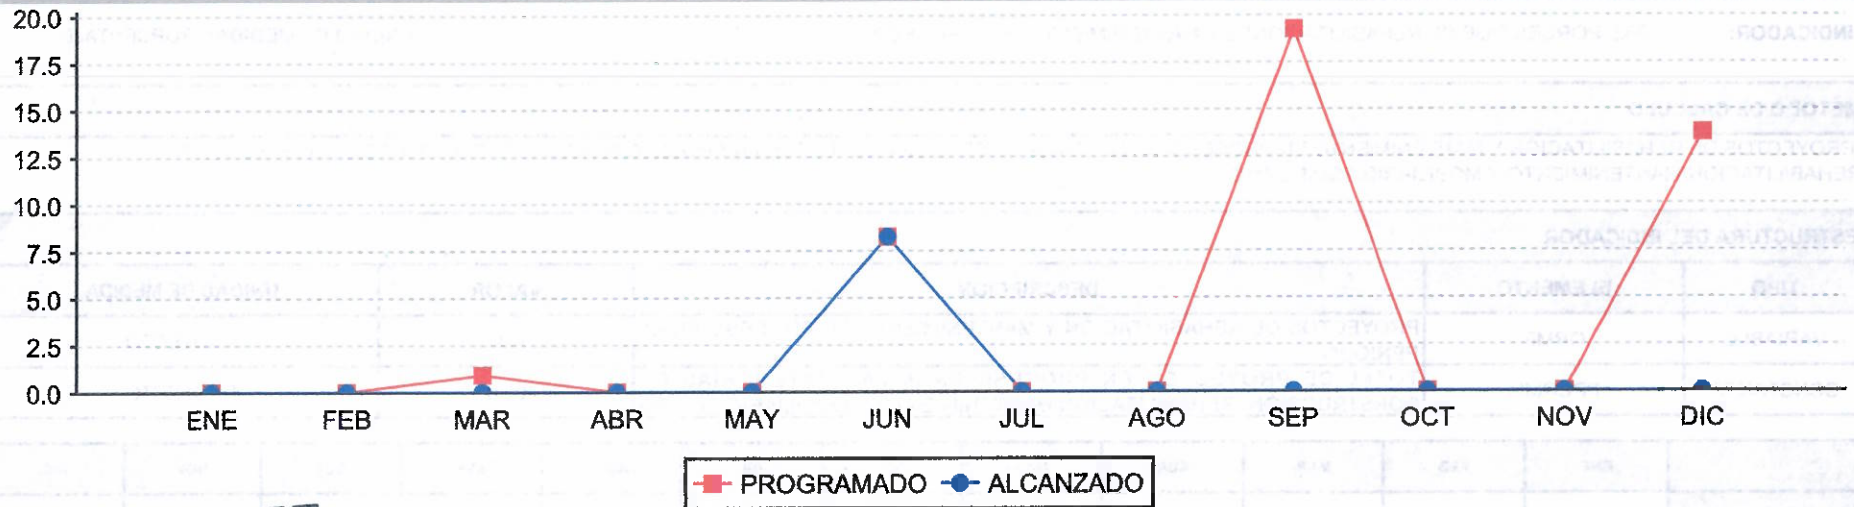


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

**DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN**

C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 596-REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 362-PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	15.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO

ADMINISTRACIÓN
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 595. CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 359. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CRMR	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO	13.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCRMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	18.29	0.00	0.00	21.95	0.00	0.00	13.41
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

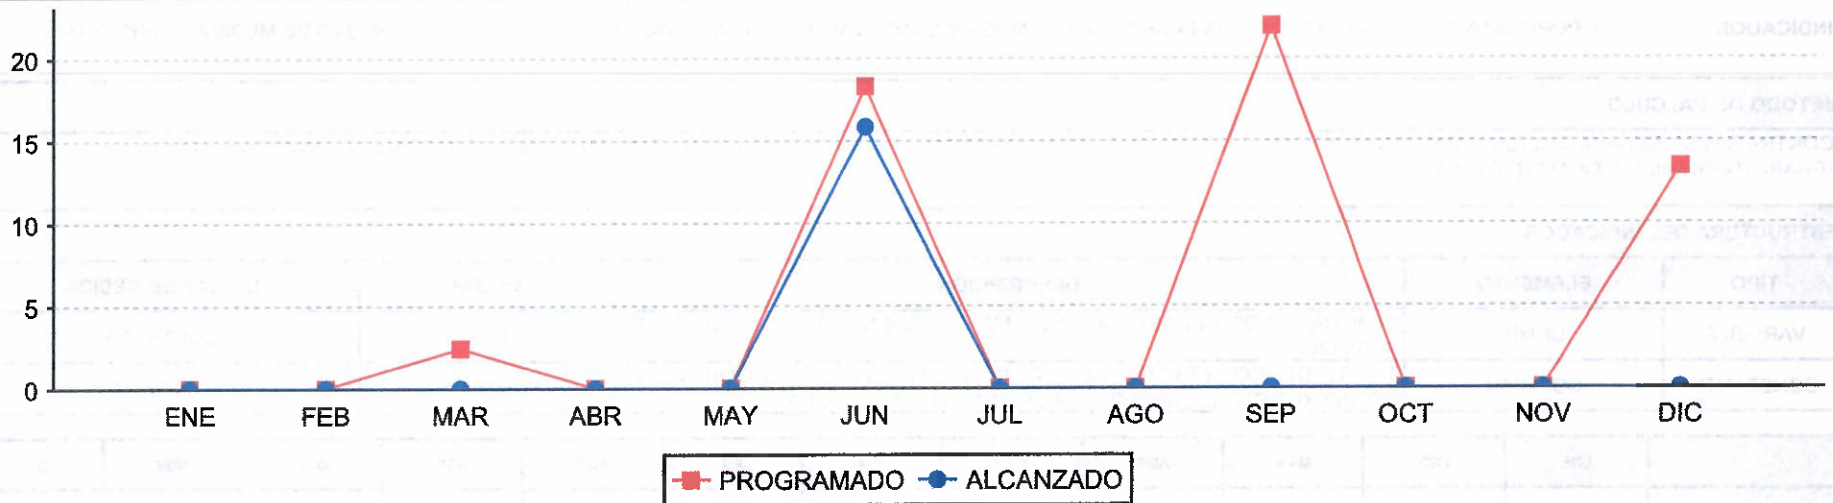


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 595-CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 359-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE OBRA <http://itife.gob.mx/contratos%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

**DEPARTAMENTO
ELABORÓ
ADMINISTRACIÓN**

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



**RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCION GENERAL**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



**AUTORIZÓ
DIRECCION GENERAL**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 594. VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 356. PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO/TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	VRM	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	12.00	VISITA
CONSTANTE	VCRM	TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	76.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00	1.32
EVALUADO	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

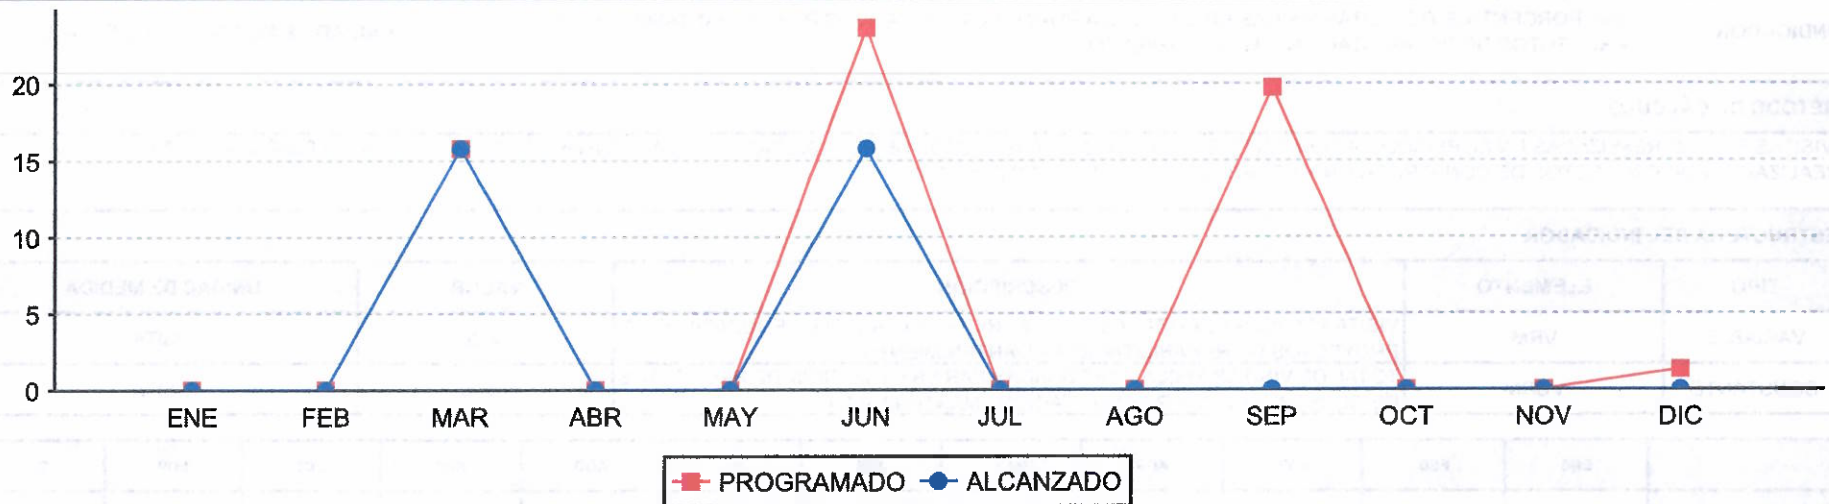


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 594-VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 356-PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROYECTOS EJECUTIVOS <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN
C.P. JORGE FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 593. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 354. PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	OCP	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO	4.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRMM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	10.09
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

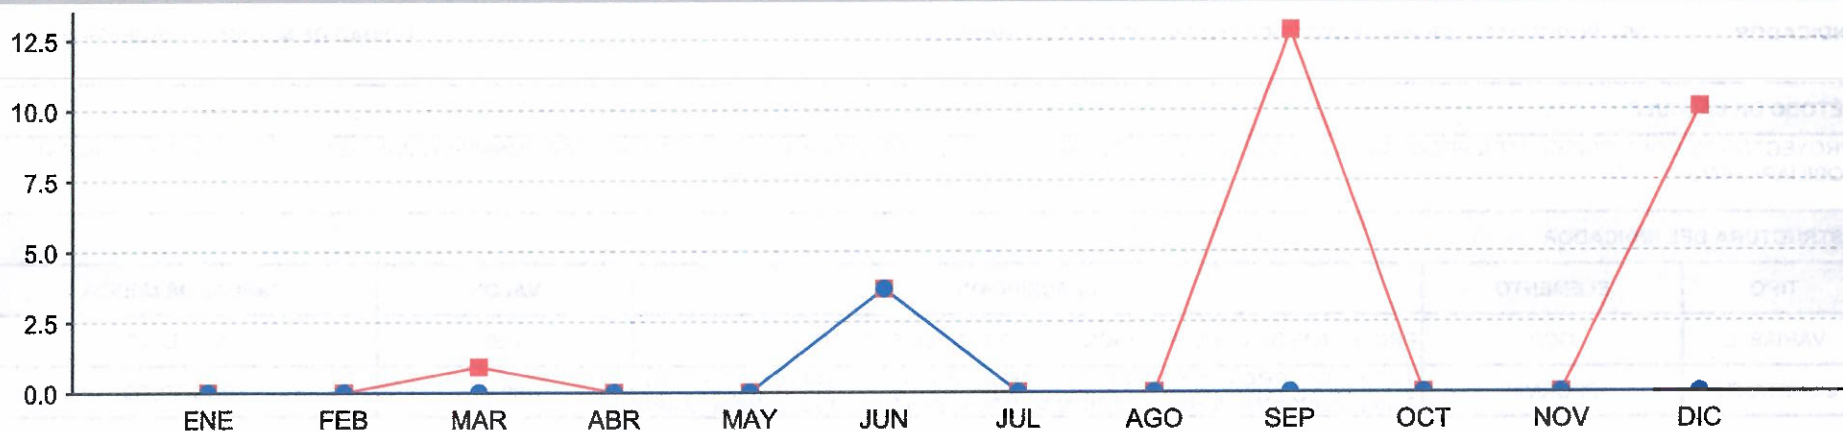

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMADO (red square) ALCANZADO (blue circle)



<p>ELABORO</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p>	<p>AUTORIZO</p>
<p>C.P. JAME FERNANDEZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>DIRECTOR GENERAL</p>	<p>DIRECTOR GENERAL</p>

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 593-PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 354-PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ



DIRECCIÓN GENERAL
 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

ELABORÓ DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO DIRECCIÓN GENERAL LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZACIÓN DIRECCIÓN GENERAL LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 592. CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 351. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CCR	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO	6.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCRMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	13.41
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

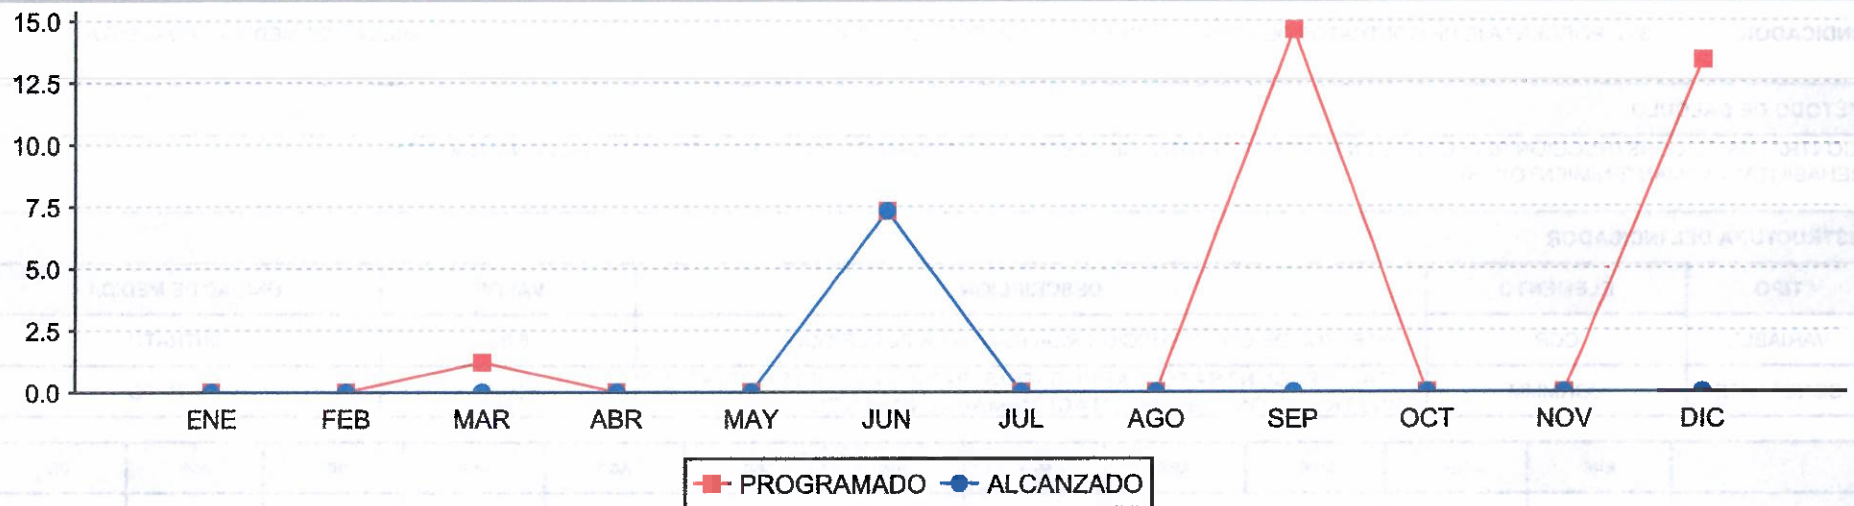


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

C.P. DAVID FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

LIC. MIGUEL HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 592-CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 351-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS <http://itife.gob.mx/contratos%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

**DEPARTAMENTO
ELABORÓ
ADMINISTRACIÓN**

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



**RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



**AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 591. VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 350. PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	VFC	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	12.00	VISITA
CONSTANTE	VCRM	TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	76.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	2.63
EVALUADO	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

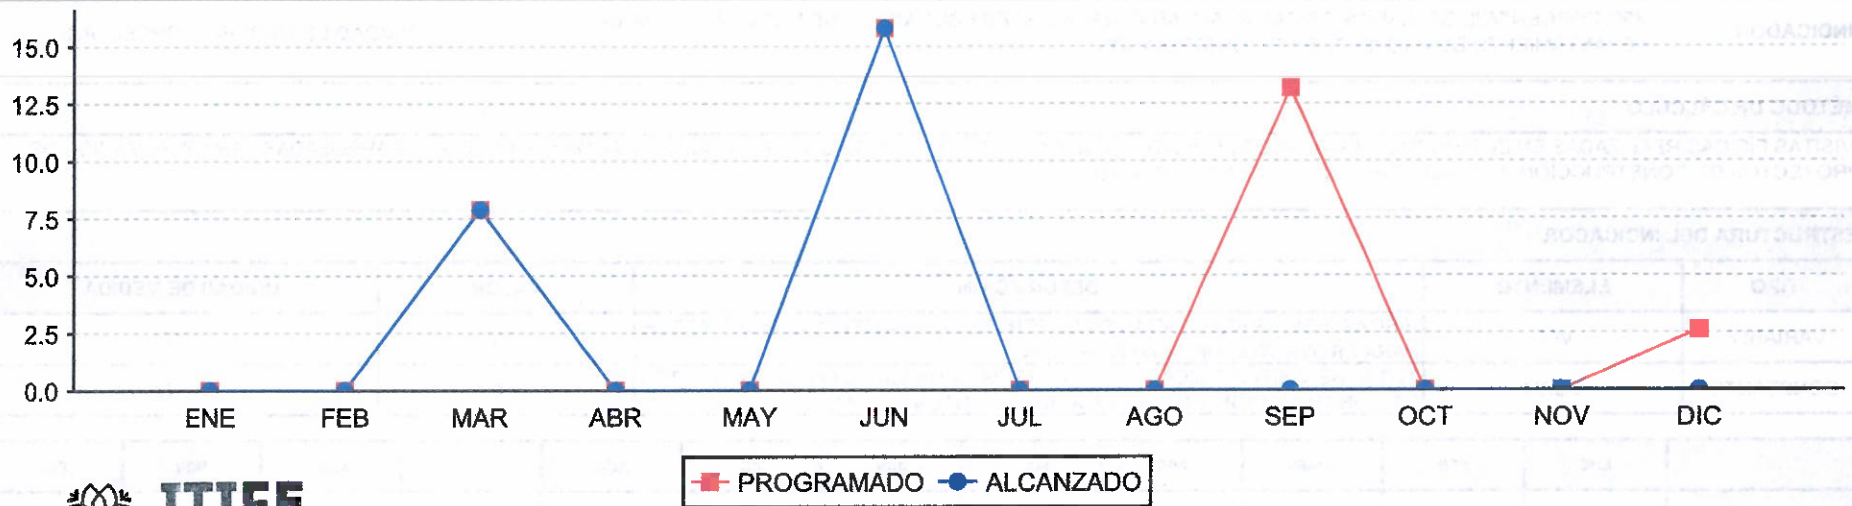

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



DIRECCIÓN GENERAL
DIRECTOR GENERAL



DIRECCIÓN GENERAL
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 591-VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 350-PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROYECTOS EJECUTIVOS <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

**DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN**

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



**RESPONSABLE DEL PROYECTO
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE

**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 588. MUJERES ALUMNAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 343. PORCENTAJE DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MBF	ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	297.00	MUJER
CONSTANTE	TAM	TOTAL DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO	122,149.00	MUJER

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	4.49
EVALUADO	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

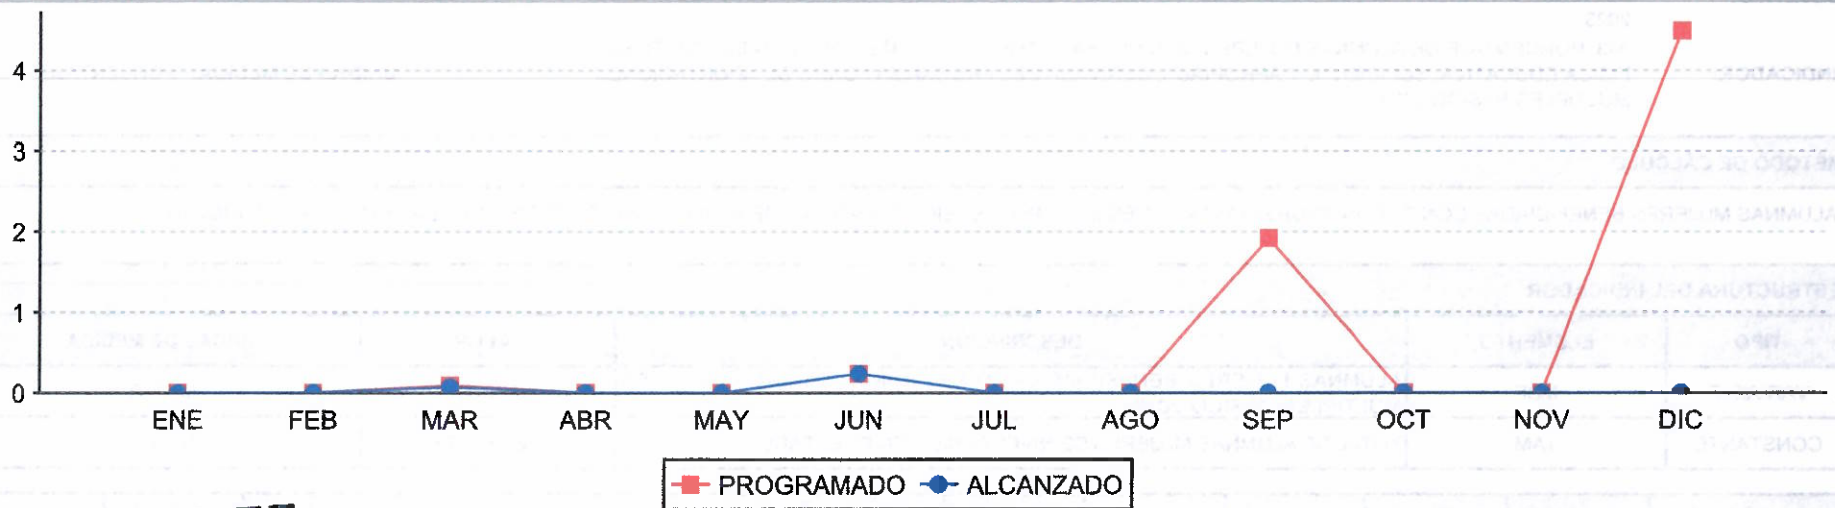



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

C.P. ADRIÁN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ


JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 588-MUJERES ALUMNAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 343-PORCENTAJE DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	5,475.00
ALCANZADO	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	78.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

FÍSICA EDUCATIVA
ELABORÓ
DEPARTAMENTO

C.P. JUAN FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



RESPONSABLE DEL DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



SECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 587. HOMBRES ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 341. PORCENTAJE DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO EN ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	HBF	HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	250.00	HOMBRE
CONSTANTE	TAH	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO EN ESTADO	125,529.00	HOMBRE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	4.46
EVALUADO	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

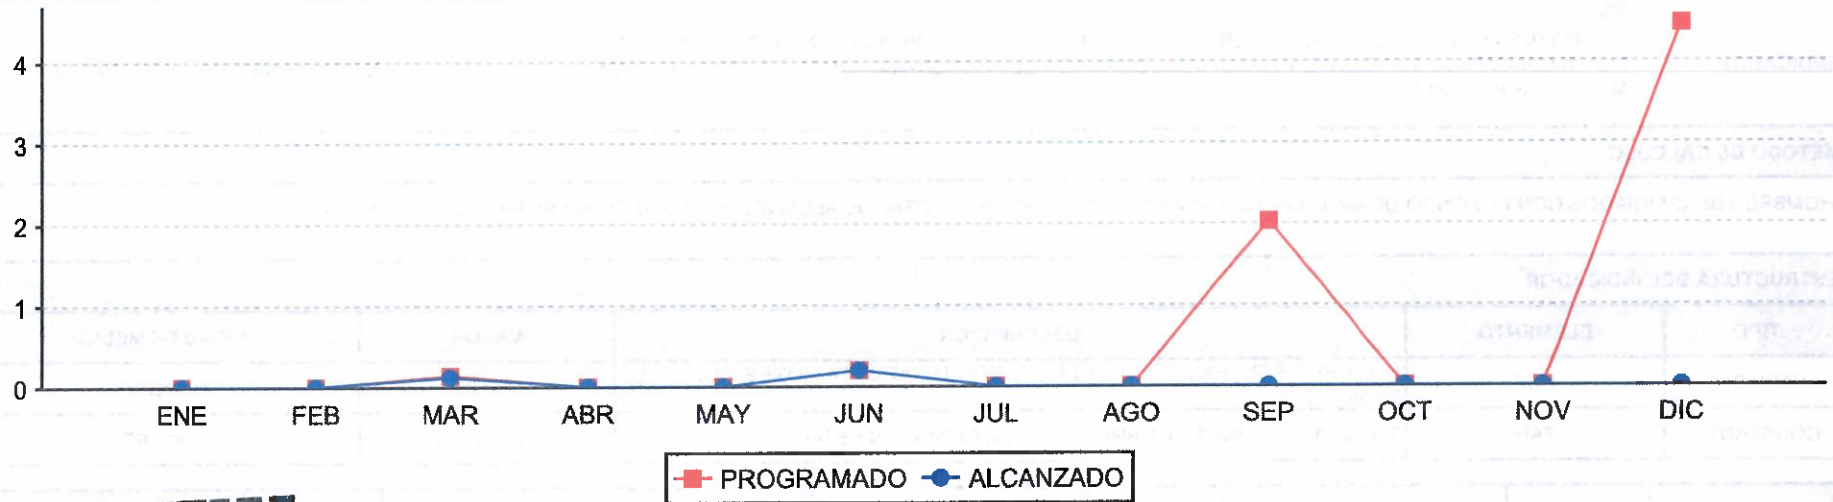


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

C.F. JIMÉ PERALTA HERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 587-HOMBRES ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 341-PORCENTAJE DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	5,594.00
ALCANZADO	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	84.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
---	--	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA
OBJETIVO:	586. HOMBRES Y MUJERES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	SEMESTRAL
INDICADOR:	339. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PBT	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	841.00	ESTUDIANTE
CONSTANTE	TPE	TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO	247,878.00	ESTUDIANTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

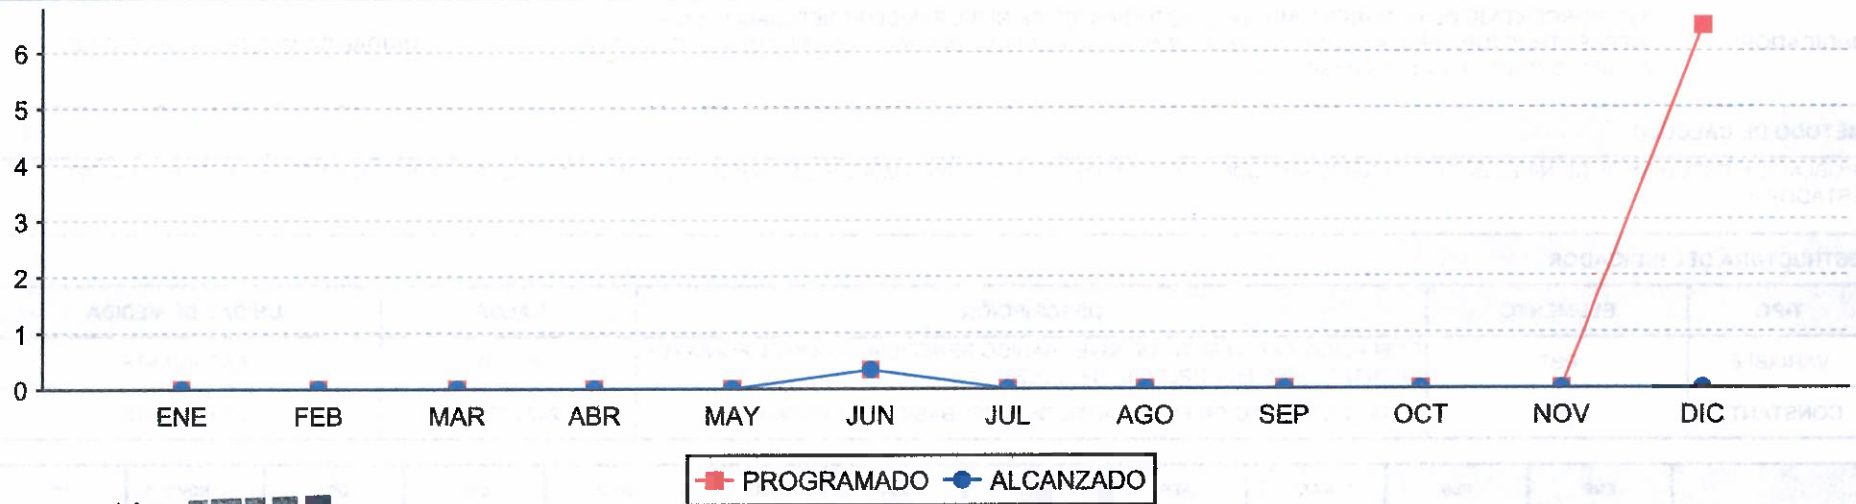


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN




ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL RIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL RIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 586-HOMBRES Y MUJERES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 339-PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO

ELABORO
C.P. JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



AUTORIZO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 583. MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR ENTREGADO A TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL

INDICADOR: 320. PORCENTAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ENTREGADO A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PMET	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO	0.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

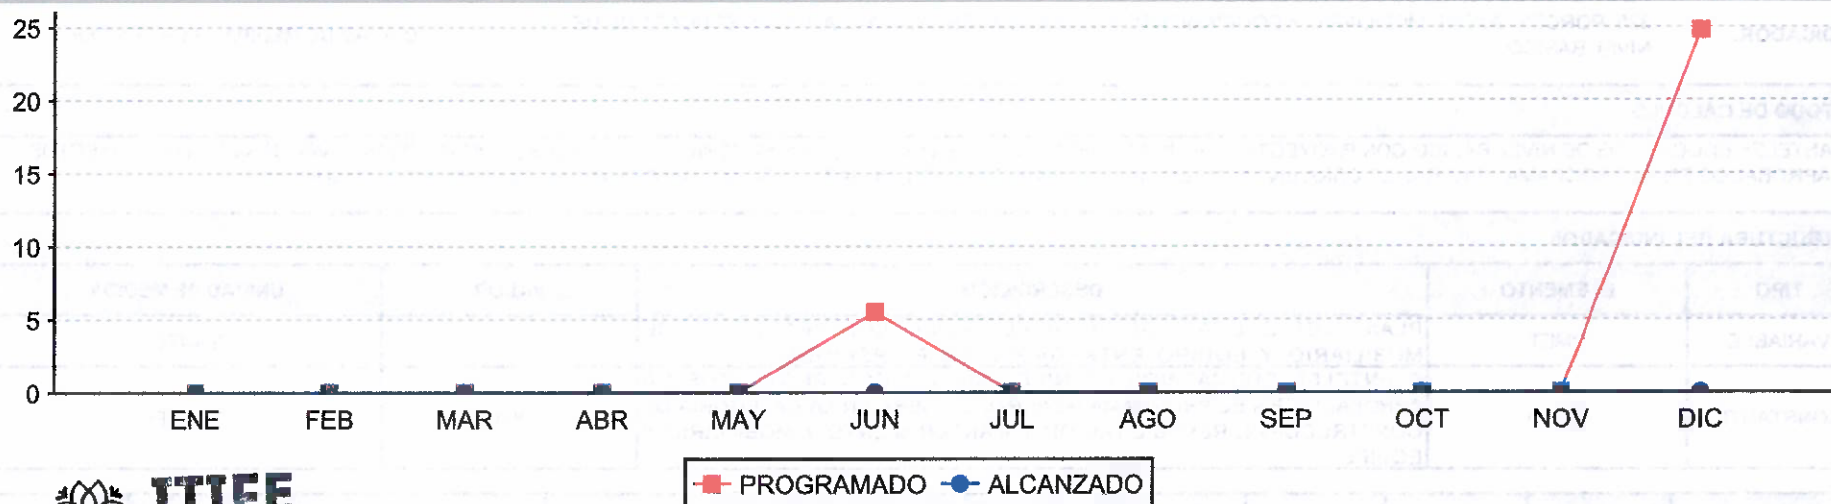


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 583-MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR ENTREGADO A TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 320-PORCENTAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ENTREGADO A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/acta%20entrega%20mobiliario%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**

ELABORÓ
C.P. JANE PERNANDEZ HERNANDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



RESPONSABLE DEL PROYECTO
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



AUTORIZÓ
DIRECCIÓN GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 582. REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS ENTREGADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL

INDICADOR: 355. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PRMT	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO	0.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

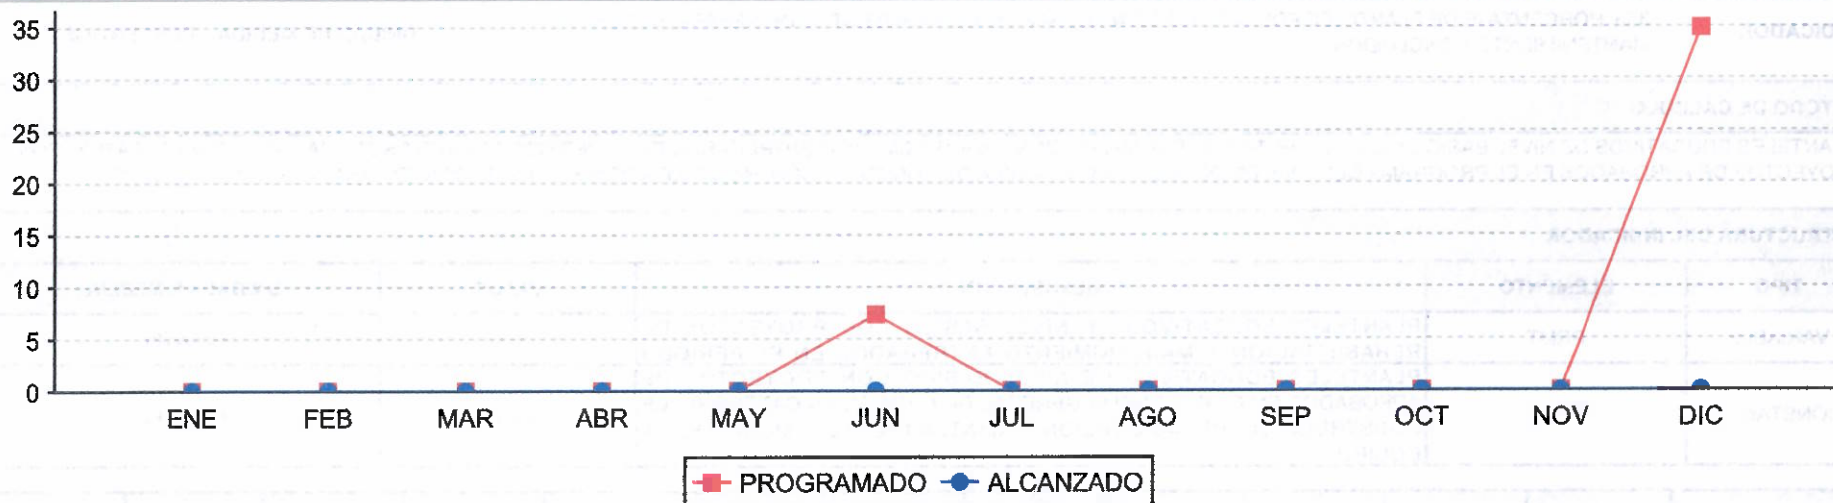

ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

ANTORIZO
LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 582-REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS ENTREGADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 355-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 54. CONSTRUCCIONES ENTREGADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL

INDICADOR: 349. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PCT	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO	0.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

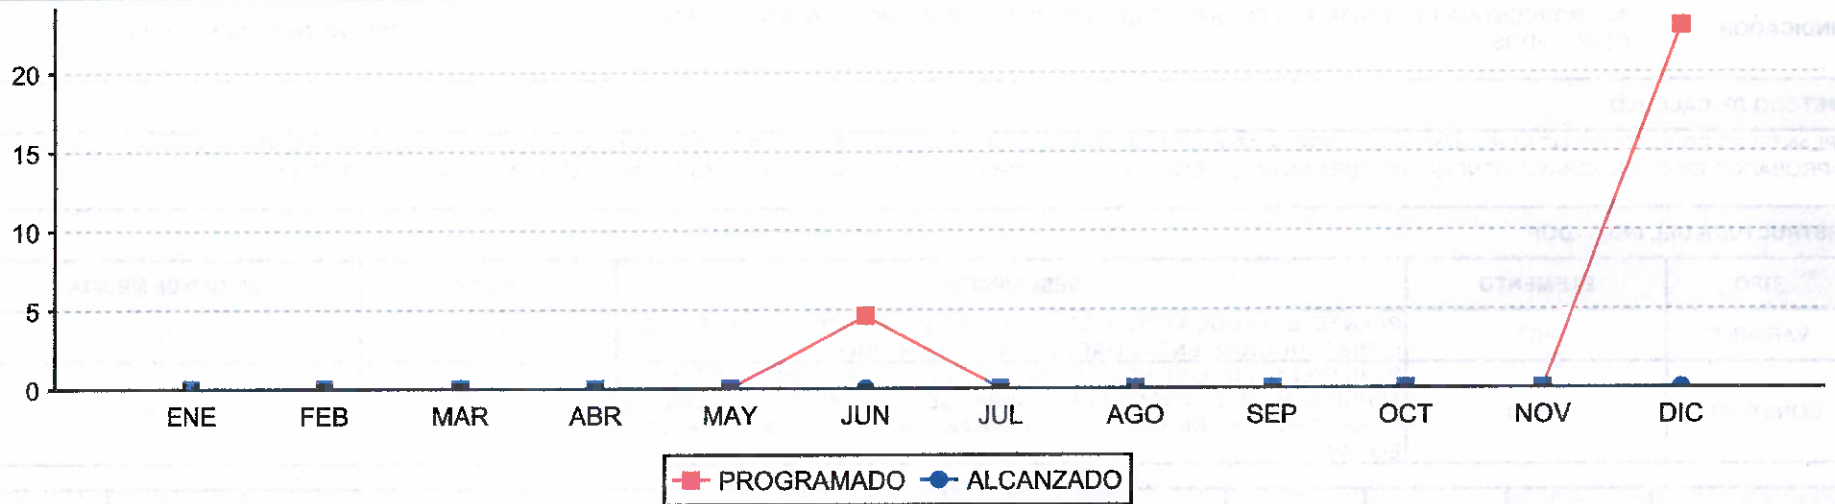


ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA**

FÍSICA EDUCATIVA

**DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN**

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCION GENERAL

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 54-CONSTRUCCIONES ENTREGADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 349-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA**
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	DIRECCIÓN GENERAL DIRECTOR GENERAL
--	---	--
