



**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
AL 30 DE DICIEMBRE 2023**



Clasificación Pp:	E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
U. Responsable:	DIRECCIÓN GENERAL
Proyecto:	5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO 4TO TRIMESTRE	ALCANZADO	ACUMULADO ANUAL	OBSERVACIONES
F	FIN	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16810	16810	16810	16810	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
P	PROPOSITO	NUMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	PLANTEL	109	109	109	150	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
C	1	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	30	25	25	35	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	46	38	38	40	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	3	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO	PLANTEL	33	27	27	27	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	4	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	ESTUDIANTE	16810	15969	15969	841	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	1.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	VISITA	30	2	2	80	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.

**ITIFE**INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
AL 30 DE DICIEMBRE 2023****TLAXCALA**
UNA NUEVA HISTORIA

Clasificación Pp:	E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
U. Responsable:	DIRECCIÓN GENERAL
Proyecto:	5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO 4TO TRIMESTRE	ALCANZADO	ACUMULADO ANUAL	OBSERVACIONES
A	1.2	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	30	11	11	80	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	1.3	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	30	11	11	80	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	2.1	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	VISITA	46	1	1	70	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	2.2	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	46	11	11	70	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	2.3	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO	PROYECTO	46	15	15	70	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	3.1	CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO	CONTRATO	6	3	3	7	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	3.2	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA	PROYECTO	33	18	18	8	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.
	4.1	HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	HOMBRE	8573	5594	5594	2979	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.



**INFORME DE AVANCE DE INDICADORES
AL 30 DE DICIEMBRE 2023**



Clasificación Pp:	E DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES / PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
Entidad:	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
U. Responsable:	DIRECCIÓN GENERAL
Proyecto:	5 - 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO 4TO TRIMESTRE	ALCANZADO	ACUMULADO ANUAL	OBSERVACIONES
	4.2	ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	MUJER	8237	5475	5475	2762	SE ALCANZA LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO.

ELABORÓ:

C.P. Jaqueline Durillo Ortega
Programador Contable del ITIFE

REVISÓ:

C.P. Jaime Hernández Hernández
Jefe de Departamento de Administración del ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

AUTORIZÓ:

Lic. Miguel Piedras Díaz
Director del ITIFE
DIRECCIÓN GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

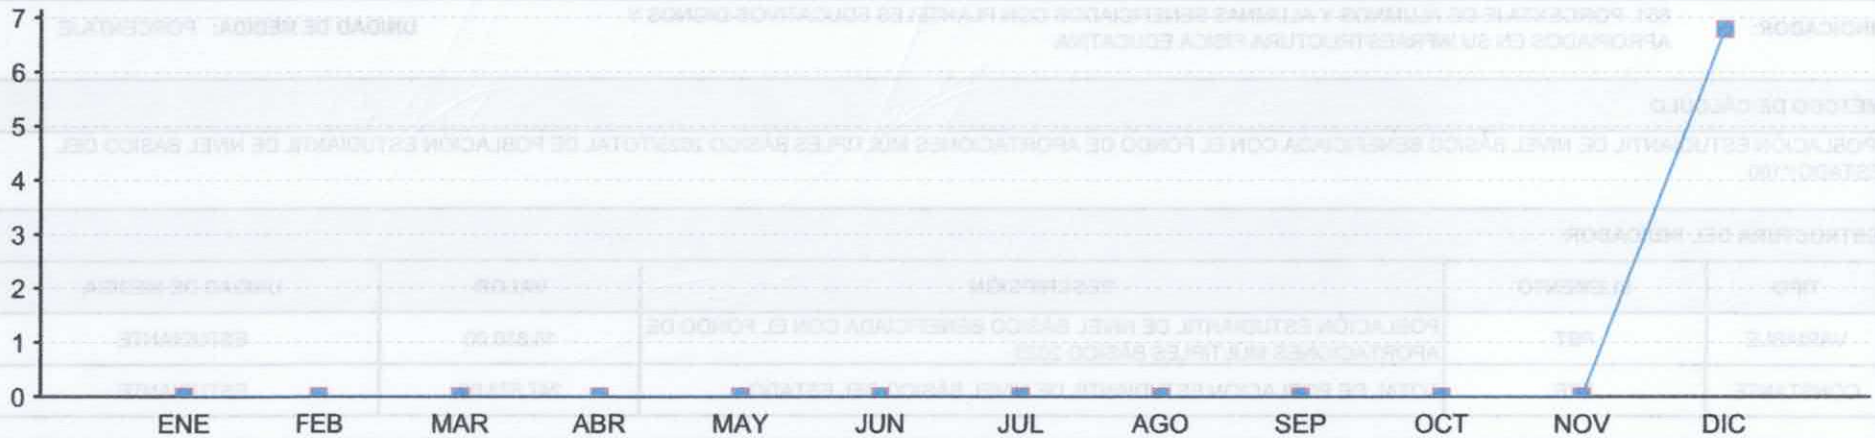

■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

<p>ELABORADO</p> <p>ITIFE</p> <p>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p>DIRECCION GENERAL</p>	<p>AUTORIZADO</p> <p>ITIFE</p> <p>INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA</p>
<p>C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ</p> <p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>	<p>LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ</p> <p>DIRECTOR GENERAL</p>

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 584. CONTRIBUIR AL APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ALUMNOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL

INDICADOR: 651. PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON PLANTELES EDUCATIVOS DIGNOS Y APROPIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PBT	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	16,810.00	ESTUDIANTE
CONSTANTE	TPE	TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO	247,678.00	ESTUDIANTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 584-CONTRIBUIR AL APRENDIZAJE DE LAS Y LOS ALUMNOS MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 651-PORCENTAJE DE ALUMNOS Y ALUMNAS BENEFICIADOS CON PLANTELES EDUCATIVOS DIGNOS Y APROPIADOS EN SU INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,810.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
ELABORÓ C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 585. PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUFICIENTE Y APROPIADA **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** ANUAL
INDICADOR: 325. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUFICIENTE Y APROPIADA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PEB	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	109.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPB	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO	1,606.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.79

DIRECTOR GENERAL LIC. MIGUEL PÉREZ DÍAS	DIRECTOR GENERAL LIC. MIGUEL PÉREZ DÍAS	DIRECTOR GENERAL LIC. MIGUEL PÉREZ DÍAS
--	--	--

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 585-PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUFICIENTE Y APROPIADA **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 325-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA SUFICIENTE Y APROPIADA

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS BENEFICIADOS DE NIVEL BÁSICO CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

 ELABORÓ C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL	 AUTORIZÓ LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL
---	---	---	--	---	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 54. CONSTRUCCIONES ENTREGADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL

INDICADOR: 349. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PCT	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO	25.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.94

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL
------------------	------------------	------------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 54-CONSTRUCCIONES ENTREGADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 349-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA, ACTA ENTREGA RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

**INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN**

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



MES	PROGRAMADO (%)	ALCANZADO (%)
ENE	0	0
FEB	0	0
MAR	0	0
ABR	0	0
MAY	0	0
JUN	8	0
JUL	0	0
AGO	0	0
SEP	0	0
OCT	0	0
NOV	0	0
DIC	0	35

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 582. REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS ENTREGADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL

INDICADOR: 355. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PRMT	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO	38.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.86

SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS
C. P. JABIE FERRANDEZ HERNANDEZ	C. P. JABIE FERRANDEZ HERNANDEZ	C. P. JABIE FERRANDEZ HERNANDEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVOS: 582-REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS ENTREGADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 355-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTAS ENTREGA RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

<p>ELABORÓ</p>  <p>C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p> <p align="center">ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>	<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p>  <p>LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL</p> <p align="center">ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCION GENERAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p>  <p>LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL</p> <p align="center">ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCION GENERAL</p>
---	---	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

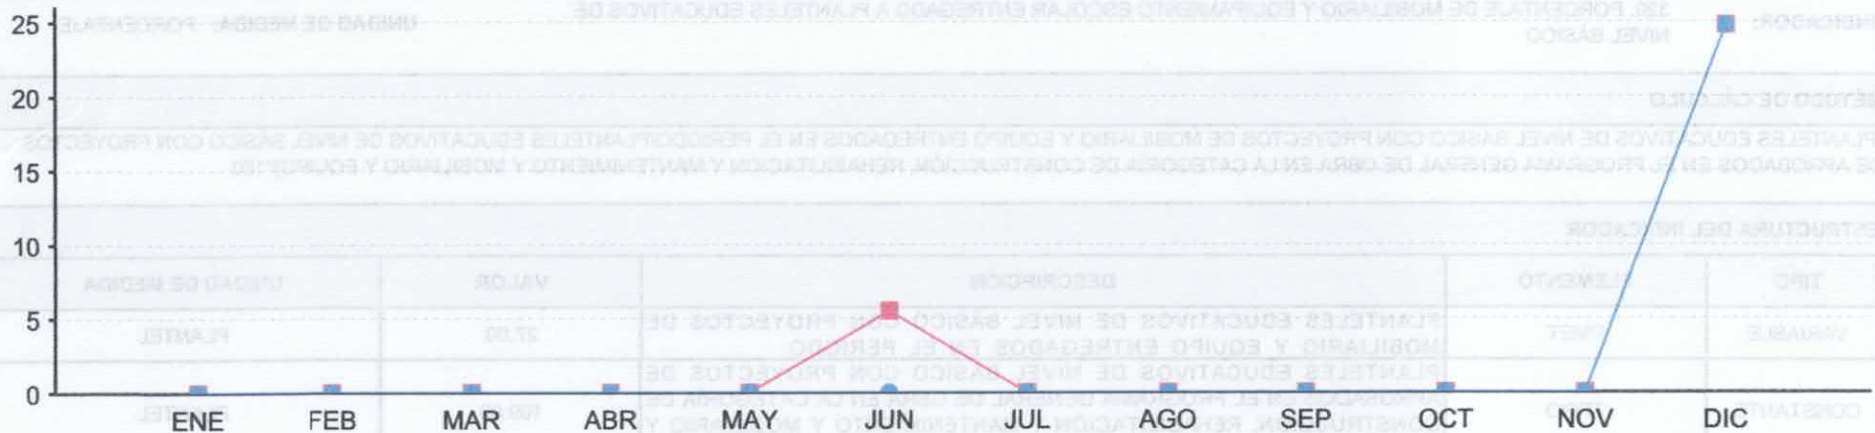

■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 583. MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR ENTREGADO A TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL
INDICADOR: 320. PORCENTAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ENTREGADO A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO/PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PMET	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO	27.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPGO	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE APROBADOS EN EL PROGRAMA GENERAL DE OBRA EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO Y EQUIPO	109.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.78
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.77

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA




OBJETIVOS: 583-MOBILIARIO Y EQUIPO ESCOLAR ENTREGADO A TALLERES, LABORATORIOS E INSTALACIONES DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 320-PORCENTAJE DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ENTREGADO A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN <http://itife.gob.mx/acta%20entrega%20mobiliario%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO ENTREGADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

DIRECCION GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



PROGRAMADO (Red square) ALCANZADO (Blue circle)

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 586. HOMBRES Y MUJERES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** SEMESTRAL
INDICADOR: 339. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PBT	POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	15,969.00	ESTUDIANTE
CONSTANTE	TPE	TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO	247,678.00	ESTUDIANTE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.45

SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS
SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA



OBJETIVOS: 586-HOMBRES Y MUJERES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE


INDICADOR: 339-PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADA CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	ITIFE	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL


FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

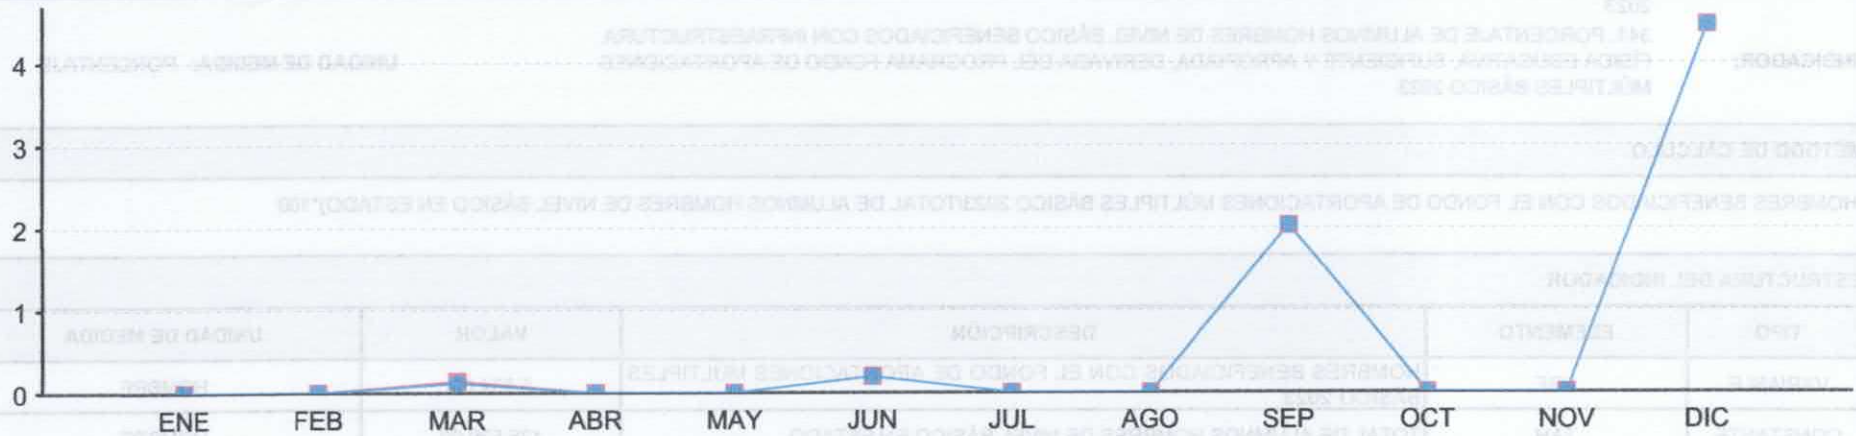

■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA
OBJETIVO:	587. HOMBRES ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	FRECUENCIA DEL INDICADOR:	TRIMESTRAL
INDICADOR:	341. PORCENTAJE DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	UNIDAD DE MEDIDA:	PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO EN ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	HBF	HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	5,594.00	HOMBRE
CONSTANTE	TAH	TOTAL DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO EN ESTADO	125,529.00	HOMBRE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.14	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	4.46
EVALUADO	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	2.03	0.00	0.00	4.46

AUTORIZA LIC. MIGUEL PÉREZ DÍAZ DIRECTOR GENERAL	RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PÉREZ DÍAZ DIRECTOR GENERAL	ELABORA LIC. JABRE PÉREZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MONITOREO
--	--	---

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA




OBJETIVOS: 587-HOMBRES ALUMNOS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 341-PORCENTAJE DE ALUMNOS HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: HOMBRES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	5,594.00
ALCANZADO	0.00	0.00	152.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	5,594.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	84.92	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL


INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN


INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

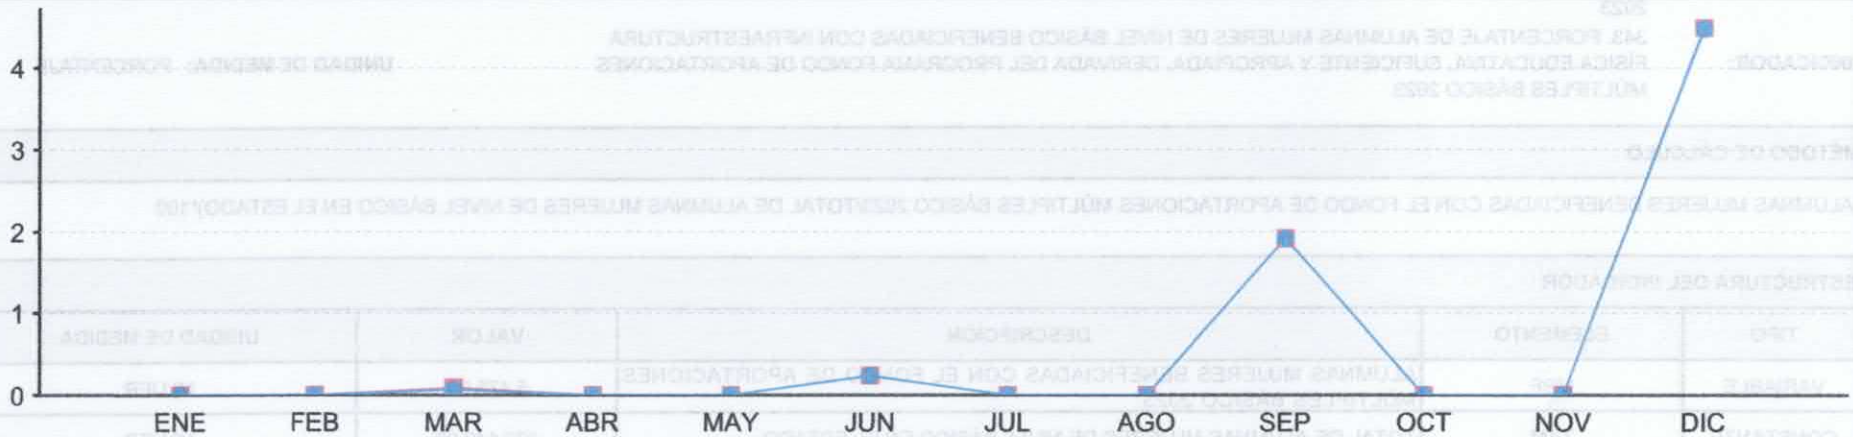

PROGRAMADO ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 588. MUJERES ALUMNAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 343. PORCENTAJE DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023/TOTAL DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MBF	ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	5,475.00	MUJER
CONSTANTE	TAM	TOTAL DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO EN EL ESTADO	122,149.00	MUJER

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	4.49
EVALUADO	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.24	0.00	0.00	1.92	0.00	0.00	4.48

SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS	SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE FINANZAS
REPORTE DE VARIABLE

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA



OBJETIVOS: 588-MUJERES ALUMNAS DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 343-PORCENTAJE DE ALUMNAS MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA, SUFICIENTE Y APROPIADA, DERIVADA DEL PROGRAMA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROGRAMA GENERAL DE OBRA 2023 EMITIDO POR USET <http://itife.gob.mx/pgo%202023.html>

VARIABLE: ALUMNAS MUJERES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	5,475.00
ALCANZADO	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	297.00	0.00	0.00	2,350.00	0.00	0.00	5,475.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	78.26	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNANDEZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA
DE LA INFRAESTRUCTURA
FÍSICA EDUCATIVA
 DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

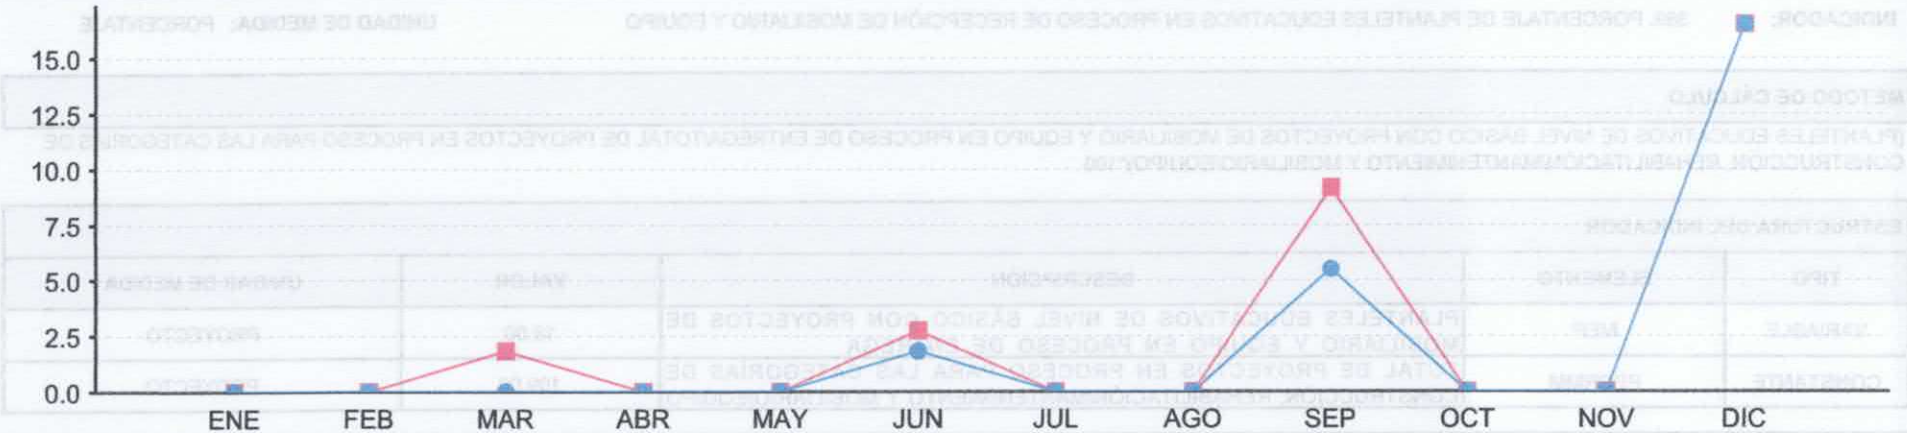

■ PROGRAMADO ● ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 598. PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL
INDICADOR: 369. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MEP	PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA	18.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRMM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	2.75	0.00	0.00	9.17	0.00	0.00	16.51
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	5.50	0.00	0.00	16.51

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE MONITOREO Y EVALUACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



PROGRAMADO ALCANZADO

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNANDEZ HERNANDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 591. VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 350. PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	VFC	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN	2.00	VISITA
CONSTANTE	VCRM	TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	76.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	2.63
EVALUADO	0.00	0.00	7.89	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	13.16	0.00	0.00	2.63

AUTORIDAD	RESPONSABLE DEL PROYECTO	ELABORÓ
LIC. MIGUEL FERRERAS BARRA	LIC. MIGUEL FERRERAS BARRA	C.P. JAIRO FERRERAS HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA







OBJETIVOS: 591-VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 350-PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROYECTOS EJECUTIVOS <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PARA PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00
ALCANZADO	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	2.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

ELABORÓ  C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN 	RESPONSABLE DEL PROYECTO  LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL 	AUTORIZÓ  LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL 
--	---	--

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA:	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
PROYECTO:	5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023	DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 592. CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 351. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CCR	CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO	11.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	13.41
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.32	0.00	0.00	14.63	0.00	0.00	13.41

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 592-CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 351-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE OBRA REALIZADOS <http://itife.gob.mx/contratos%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	11.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	ELABORÓ  C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO  LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ  LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--	---

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

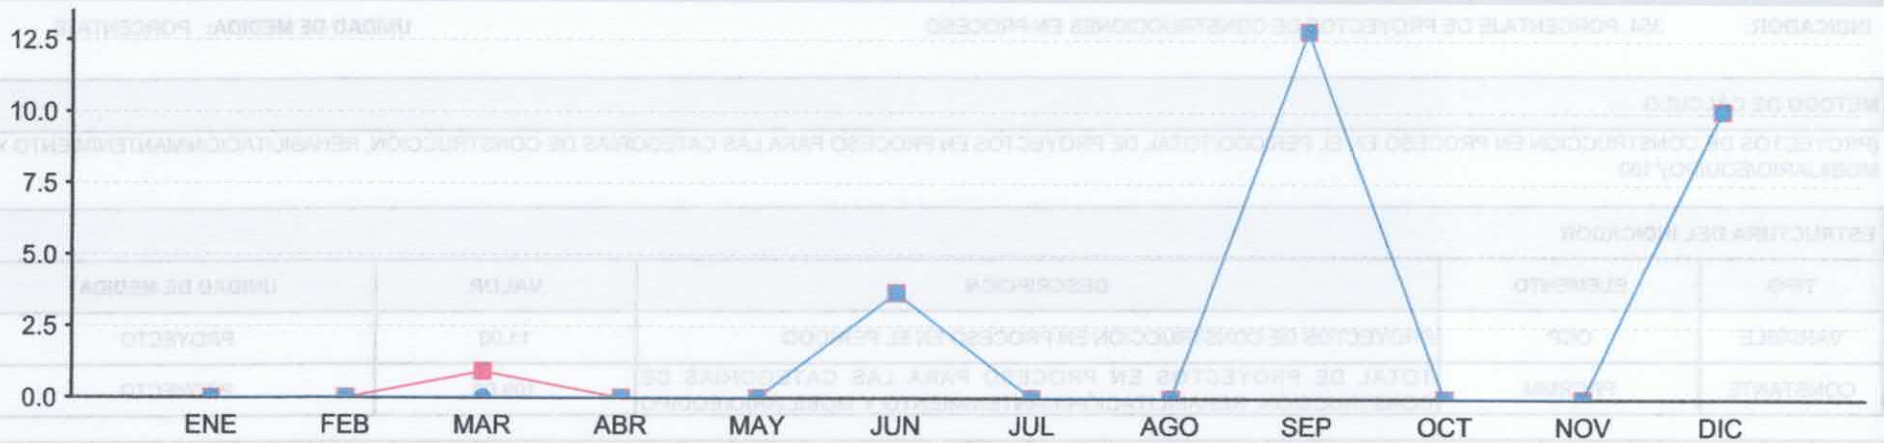

PROGRAMADO (Red square) ALCANZADO (Blue circle)



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ELABORÓ

C.P. JAIME FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DEL PROYECTO

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ

DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 593. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL
INDICADOR: 354. PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	OCP	PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO	11.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	10.09
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.67	0.00	0.00	12.84	0.00	0.00	10.09

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA


OBJETIVOS: 593-PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 354-PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIONES EN PROCESO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	11.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00

 <p>ELABORÓ C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>	 <p>RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL</p>	 <p>AUTORIZÓ LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL</p>
--	---	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

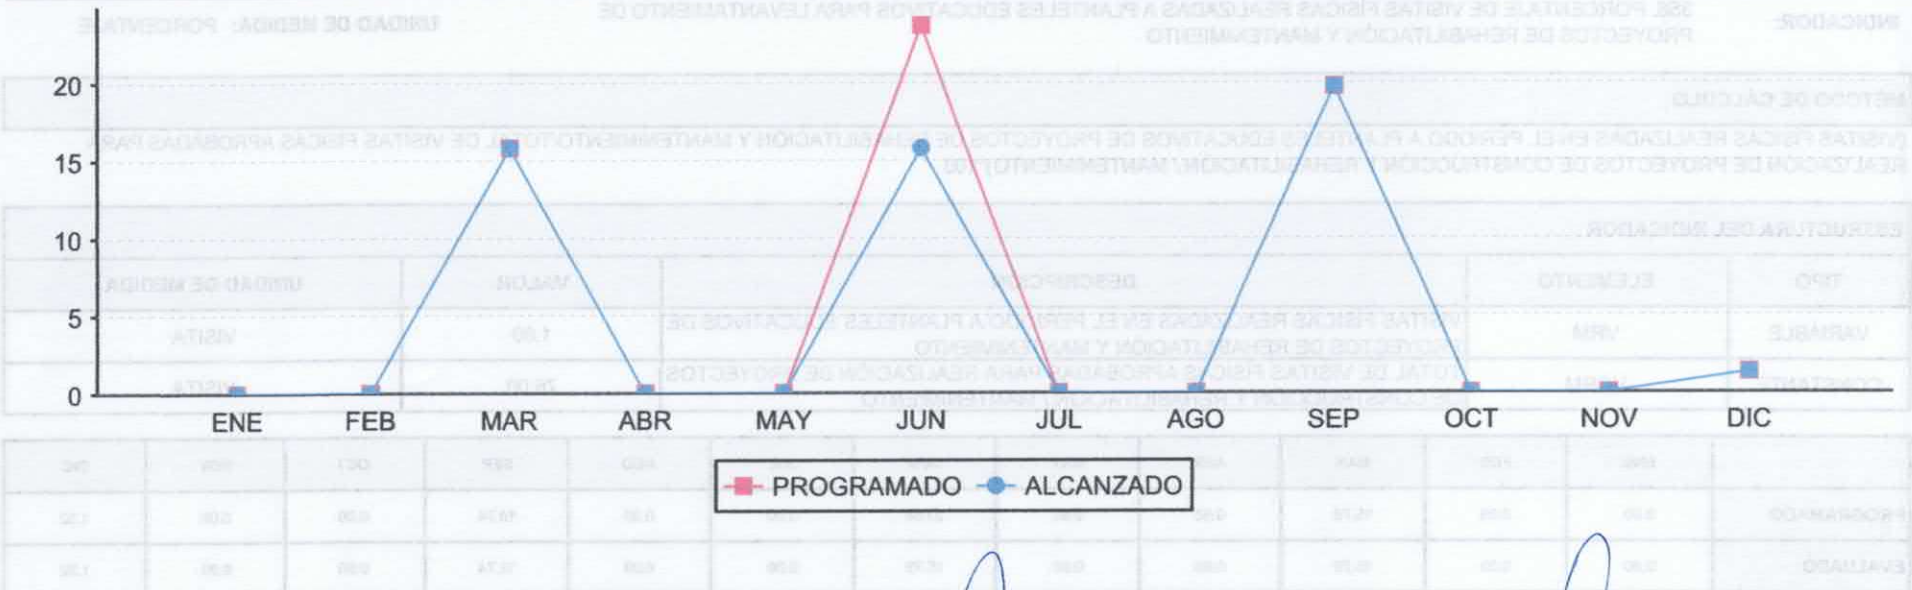

 ELABORÓ C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA RESPONSABLE DEL PROYECTO LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 AUTORIZÓ LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
--	---	--

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVO: 594. VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL

INDICADOR: 356. PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO/TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	VRM	VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	1.00	VISITA
CONSTANTE	VCRM	TOTAL DE VISITAS FÍSICAS APROBADAS PARA REALIZACIÓN DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	76.00	VISITA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	23.68	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00	1.32
EVALUADO	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	15.79	0.00	0.00	19.74	0.00	0.00	1.32

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
------------------------	------------------	------------------------	------------------	------------------------	------------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 594-VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 356-PORCENTAJE DE VISITAS FÍSICAS REALIZADAS A PLANTELES EDUCATIVOS PARA LEVANTAMIENTO DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO




MEDIO DE VERIFICACIÓN: PROYECTOS EJECUTIVOS <http://itife.gob.mx/proyectos%202023.html>

VARIABLE: VISITAS FÍSICAS REALIZADAS EN EL PERIODO A PLANTELES EDUCATIVOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.00
ALCANZADO	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	1.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
 C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	 LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

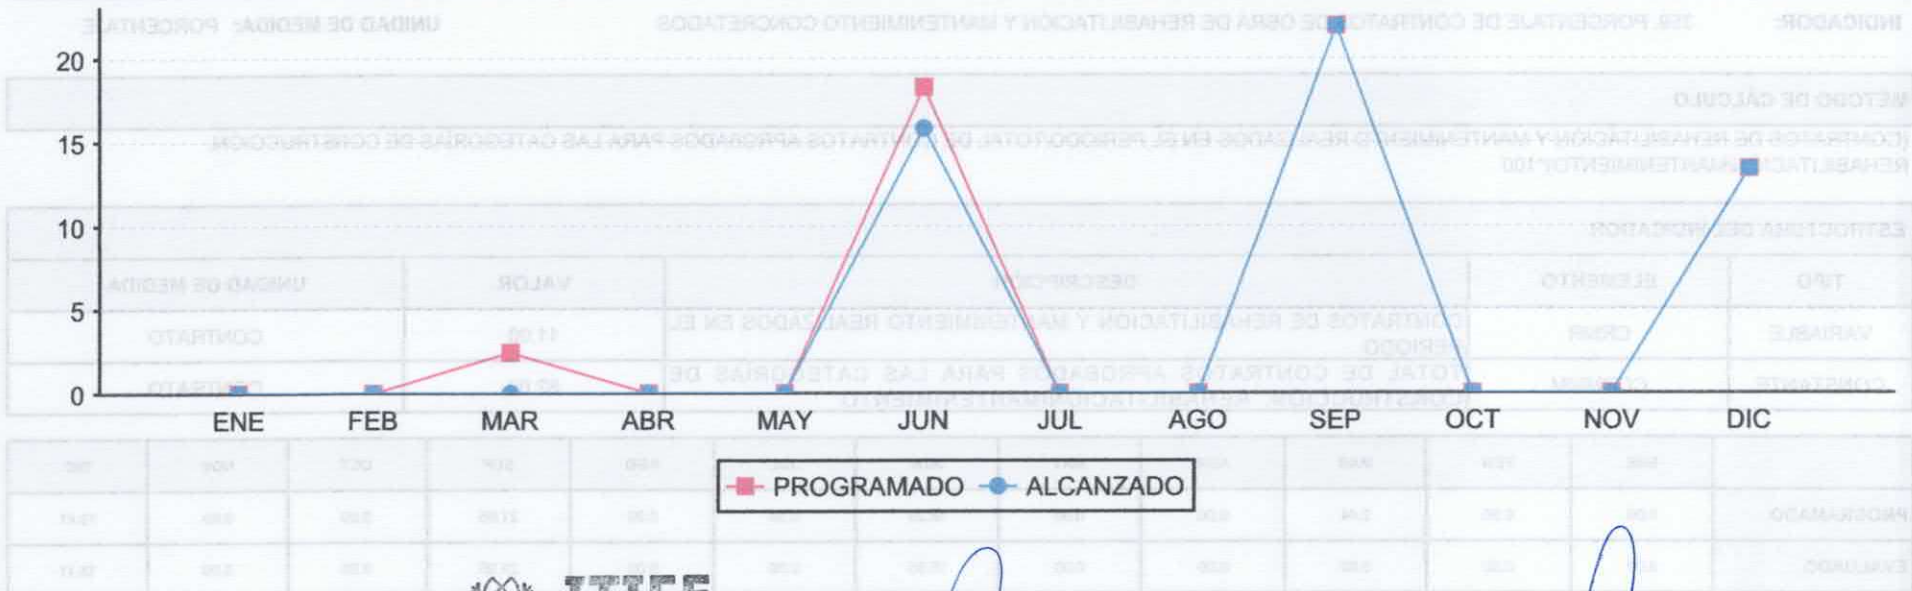

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA

DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DEL PROYECTO

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ
DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 595. CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL
INDICADOR: 359. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CRMR	CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO	11.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCRMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.44	0.00	0.00	18.29	0.00	0.00	21.95	0.00	0.00	13.41
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.85	0.00	0.00	21.95	0.00	0.00	13.41

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN	SECRETARÍA DE FINANZAS
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA


OBJETIVOS: 595-CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 359-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE OBRA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE OBRA <http://itife.gob.mx/contratos%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	11.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.67	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR



■ PROGRAMADO ● ALCANZADO



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 596. REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL
INDICADOR: 362. PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO/TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	ORMP	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO	15.00	PROYECTO
CONSTANTE	PPCRMM	TOTAL DE PROYECTOS EN PROCESO PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO/EQUIPO	109.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.92	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	13.76
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.26	0.00	0.00	19.27	0.00	0.00	13.76

SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL	SECRETARÍA DE FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
------------------------	------------------	------------------------	------------------

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 596-REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 362-PORCENTAJE DE REHABILITACIONES Y MANTENIMIENTOS EN PROCESO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: AVANCES DE OBRA DEL PROGRAMA GENERAL DE OBRA FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2023 <http://itife.gob.mx/avances%20de%20obra%202023.html>

VARIABLE: PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	15.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	0.00	0.00	21.00	0.00	0.00	15.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN


PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICIENCIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

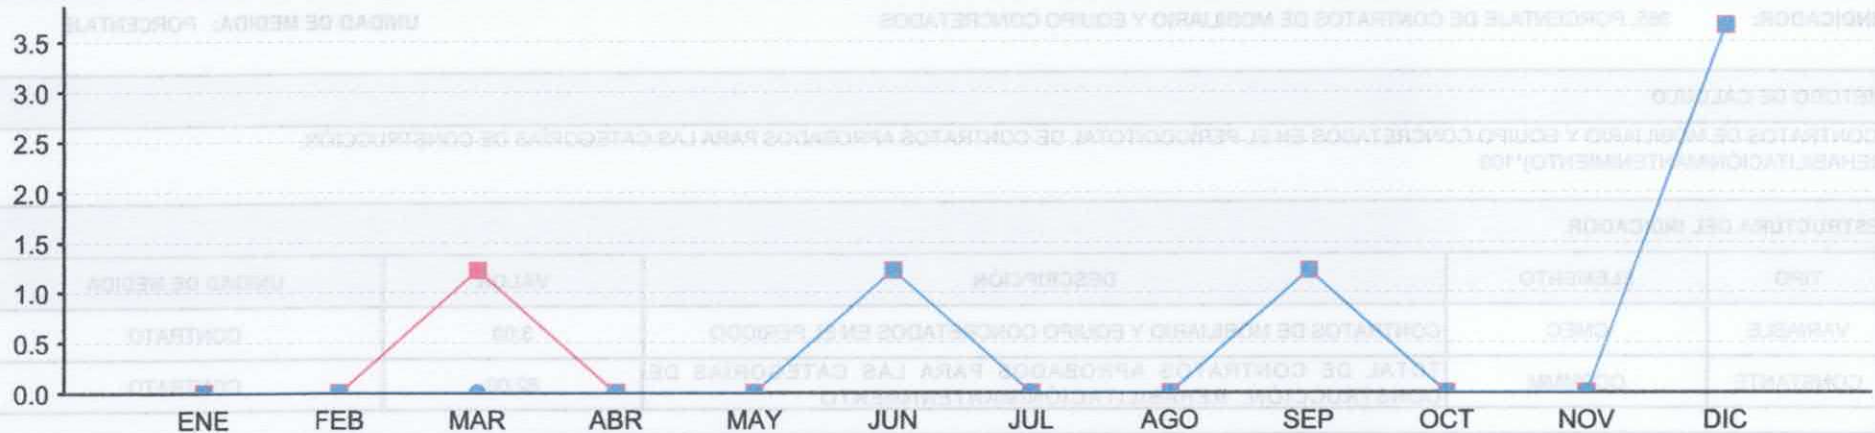

■ PROGRAMADO ● ALCANZADO



ELABORÓ	FÍSICA EDUCATIVA	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIMÉ FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR
ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN
PROYECTO: 5 / 05. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA
OBJETIVO: 597. CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** TRIMESTRAL
INDICADOR: 365. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO/TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CMEC	CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO	3.00	CONTRATO
CONSTANTE	CCRMMM	TOTAL DE CONTRATOS APROBADOS PARA LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/MANTENIMIENTO	82.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	3.66
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	1.22	0.00	0.00	3.66

AUTORIDAD	RESPONSABLE DEL PROYECTO	ELABORÓ
DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR GENERAL	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 597-CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 365-PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS

MEDIO DE VERIFICACIÓN: CONTRATOS DE MOBILIARIO / EQUIPO Y REQUISICIONES <http://itife.gob.mx/requisiciones%202023.html>

VARIABLE: CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS EN EL PERIODO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	3.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00



ELABORO	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40-INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 5-TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA DE CALIDAD FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2023 **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICIENCIA

OBJETIVOS: 598-PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

INDICADOR: 369-PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO

MEDIO DE VERIFICACIÓN: ACTAS ENTREGA - RECEPCIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO <http://itife.gob.mx/contratos%20mobiliario%202023.html>

VARIABLE: PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO EN PROCESO DE ENTREGA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	18.00
ALCANZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	18.00
% DE AVANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66.67	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	100.00



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
C.P. JAIME FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL	LIC. MIGUEL PIEDRAS DÍAZ DIRECTOR GENERAL
