



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

Clave FT-DA-06-00.

Oficio Núm. ITIFE/DG/JDA/1472/2025.

Tlaxcala, Tlax., 02 octubre de 2025.

Asunto: Indicadores septiembre 2025.

ACUSE

**DR. NOÉ RODRÍGUEZ ROLDAN.
COORDINADOR GENERAL DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN.
PRESENTE.**

Por este medio reciba un cordial saludo y a su vez anexo al presente, reporte de resultados de indicadores correspondiente al tercer trimestre julio – septiembre 2025 del proyecto 3-03 Transformando la Educación de Calidad (FAM Básica 2025), se reportan los avances en indicadores 1098, 1107, 1113, 1160, 1118, 1148, 1158, 1134, 1144, 1153, 1326, 1336 y 1346, y avance de indicadores del mes de septiembre del proyecto 4-04 Control Administrativo ITIFE, se reportan los avances en indicadores 1428, 1421 y 1397, así mismo, le informo que se han registrado en el Sistema Integral de Información Financiera de la Secretaría de Finanzas (SIIF), se presentan a través de medio magnético una USB anexa al presente.

Sin más por el momento, aprovecho para enviarle un cordial saludo.



CGPI

COORDINACIÓN GENERAL
DE PLANEACIÓN E INVERSIÓN

-7 OCT 2025

TELEFONEO 9:30

RECIBIDO

RECIBI ANEXO
USB

ATENAMENTE



ITIFE

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

**ARQ. MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ.
DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.**

c.c.p. Archivo.

EMB/vvl*



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CLASIFICACIÓN Pp: E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 UNIDAD RESPONSABLE: 1. DIRECCIÓN GENERAL
 PROYECTO: 3 - 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO TERCER TRIMESTRE	OBSERVACIONES
F		<p>PORCENTAJE DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL BENEFICIADA CON ENTORNOS FAVORABLES PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE TIPO PÚBLICO</p>	PORCENTAJE	7.04	0	0	0	META ANUAL
P		<p>PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA IDÓNEA (CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN/ MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)</p>	PORCENTAJE	7.04	0	0	0	META ANUAL
C	1	<p>PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS</p>	PORCENTAJE	38.14	0.85	0.85	0.85	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	2	<p>PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS</p>	PORCENTAJE	44.06	1.69	1.69	1.69	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	3	<p>PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO CONCLUIDOS</p>	PORCENTAJE	17.80	0	0	0	NO SE ESTABLECE META EN EL PERIODO
	4	<p>PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025</p>	PORCENTAJE	7.04	0.18	0.18	0.18	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
A	1.1	<p>PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO</p>	PORCENTAJE	46.39	25.77	25.77	36.08	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	1.2	<p>PORCENTAJE DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS</p>	PORCENTAJE	43.00	25.00	25.00	30.00	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	1.3	<p>PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN</p>	PORCENTAJE	38.14	21.19	21.19	23.73	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
A	2.1	<p>PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO</p>	PORCENTAJE	53.61	31.96	31.96	46.39	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	2.2	<p>PORCENTAJE DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS</p>	PORCENTAJE	52.00	28.00	28.00	36.00	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	2.3	<p>PORCENTAJE DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN</p>	PORCENTAJE	44.06	23.73	23.73	28.81	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	3.1	<p>PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS</p>	PORCENTAJE	5.00	1	1	1	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	3.2	<p>PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO</p>	PORCENTAJE	17.79	2.54	2.54	2.54	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO




INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CLASIFICACIÓN Pp: E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 UNIDAD RESPONSABLE: 1. DIRECCIÓN GENERAL
 PROYECTO: 3 - 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	PROGRAMADO TERCER TRIMESTRE	ALCANZADO TERCER TRIMESTRE	ACUMULADO TERCER TRIMESTRE	OBSERVACIONES
	4.1	PORCENTAJE DE ESTUDIANTES HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025.	PORCENTAJE	7.11	0.18	0.18	0.18	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO
	4.2	ESTUDIANTES MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	PORCENTAJE	6.97	0.18	0.18	0.18	SE CUMPLE CON LA META ESTABLECIDA EN EL PERIODO


ELABORÓ


 LICENCIADO EULALIO NAVA BRIONES
 JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
**INSTITUTO TLAXCALTECA
 DE LA INFRAESTRUCTURA
 FÍSICA EDUCATIVA**
 DEPARTAMENTO
 ADMINISTRACIÓN

AUTORIZO


 ARQUITECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ
 DIRECTOR GENERAL



ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL



ITIFE
 INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA
 INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 243. PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS AC-171 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1346. PORCENTAJE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PCCO	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	1.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPPC	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	118.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	37.29
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.85	0.00	0.00	0.00


FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

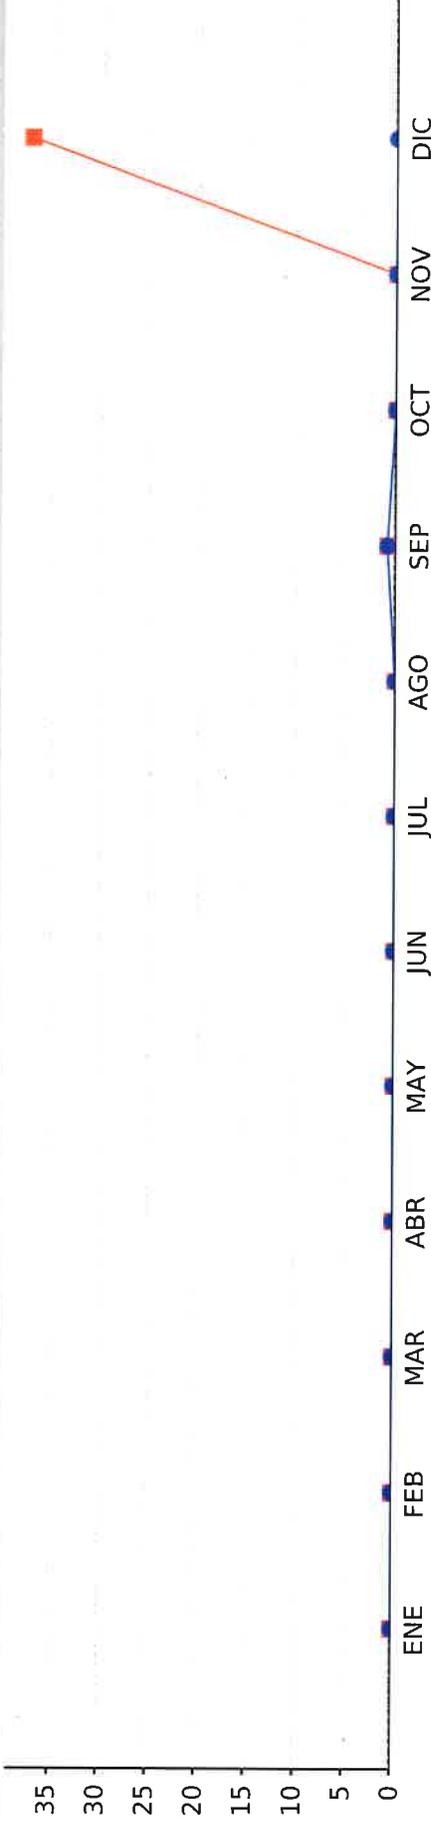

PROGRAMADO ● ALCANZADO ■

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIDAD
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 244. PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS AC-170 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1336. PORCENTAJE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCLUIDOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PCRM	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO	2.00	PLANTEL
CONSTANTE	TPPC	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO CON PROYECTOS CONCLUIDOS EN LAS CATEGORÍAS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	118.00	PLANTEL

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	42.37
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

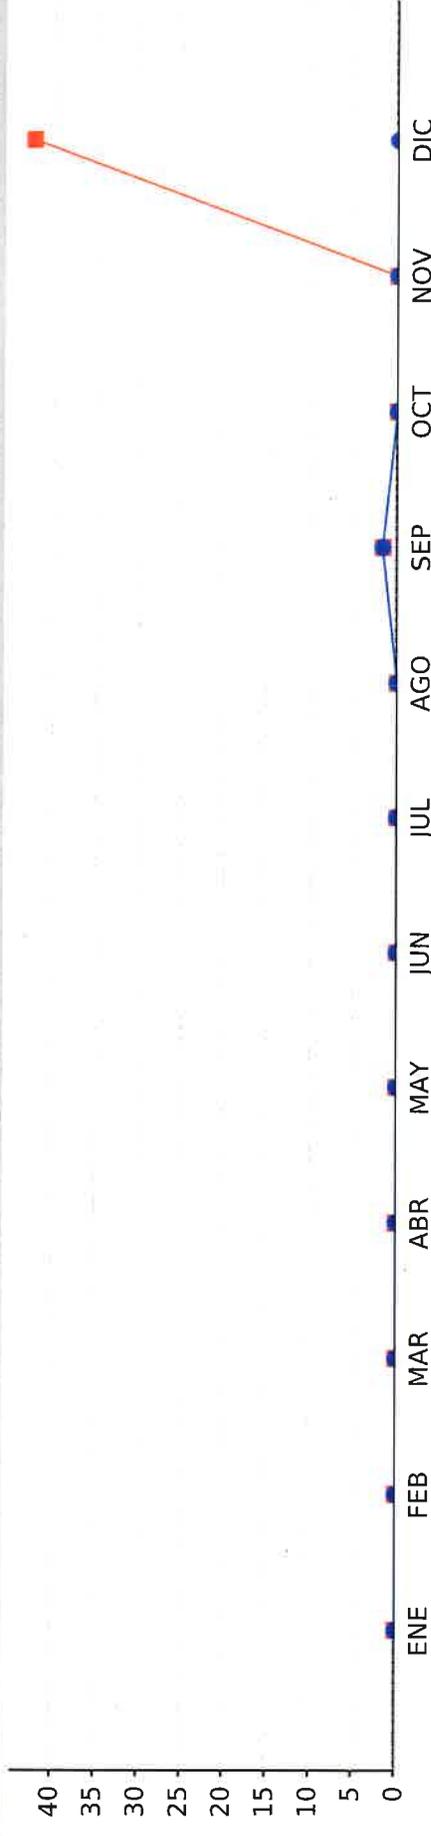

PROGRAMADO ● ALCANZADO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
EULALIO NAVA BRIONES - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
RESPONSABLE DEL PROYECTO
MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ - DIRECTOR GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL
AUTOREO
MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ - DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 246. HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1326. PORCENTAJE DE HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES 2025 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025/TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	HMEBF5	HOMBRES Y MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	445.00	ALUMNO
CONSTANTE	PEET	TOTAL DE POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA	247,133.00	ESTUDIANTE


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	6.86
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

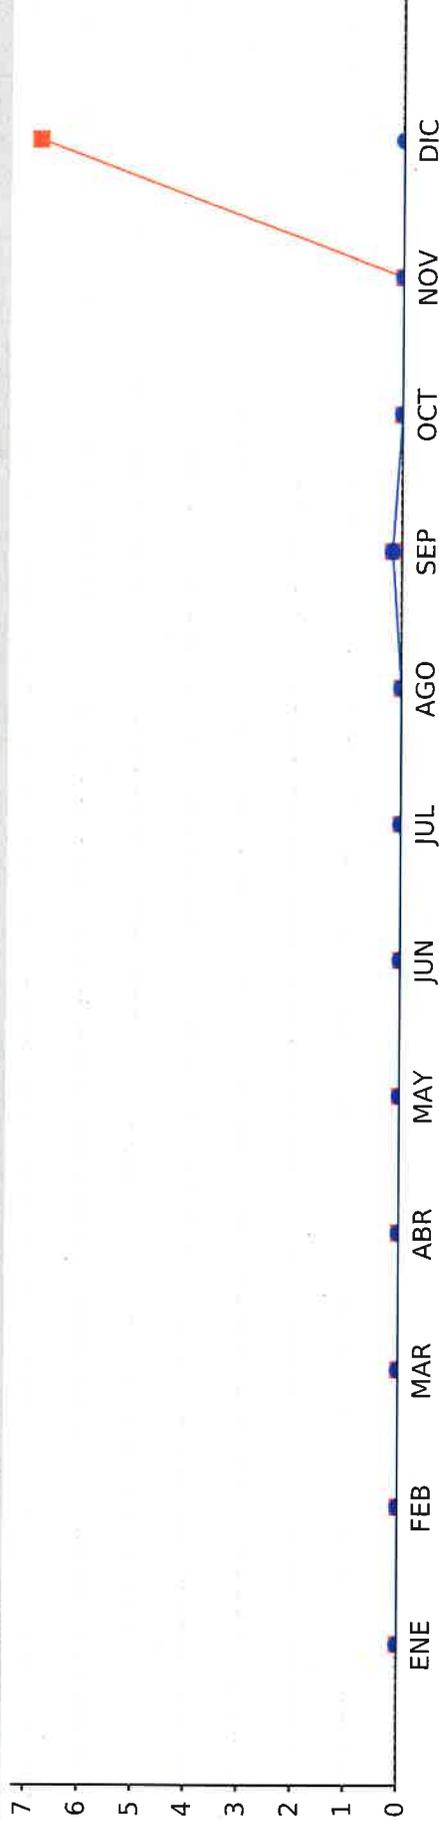

PROGRAMADO ■ ALCANZADO ●

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIDAD MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EULALIO NAVA-BRIONES	

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 247. PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO AC-171 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1153. PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE CONSTRUCCIÓN REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PECC	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	25.00	PROYECTO
CONSTANTE	TPEM	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	97.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	25.77	0.00	0.00	10.31
EVALUADO	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	9.28	0.00	0.00	25.77	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

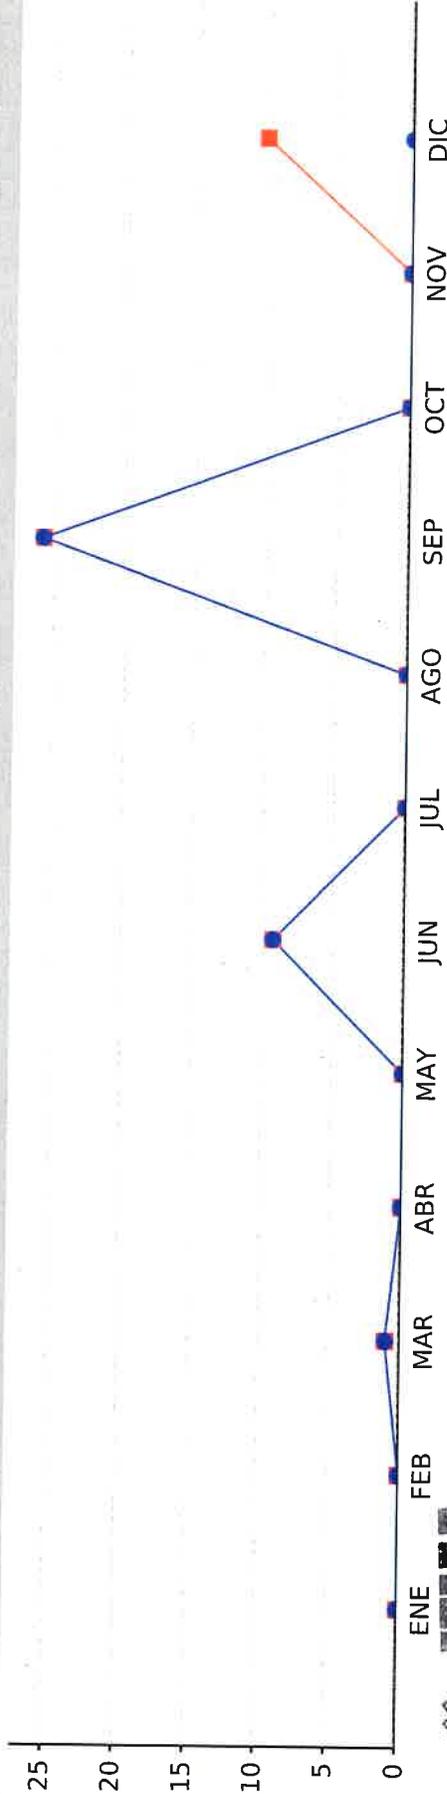

PROGRAMADO ■ **ALCANZADO** ●

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

ELABORÓ EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACION	RESPONSABLE DEL PROYECTO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 306. CONTRATOS DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1144. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CCCR	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN	25.00	CONTRATO
CONSTANTE	TCME	TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	100.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	13.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

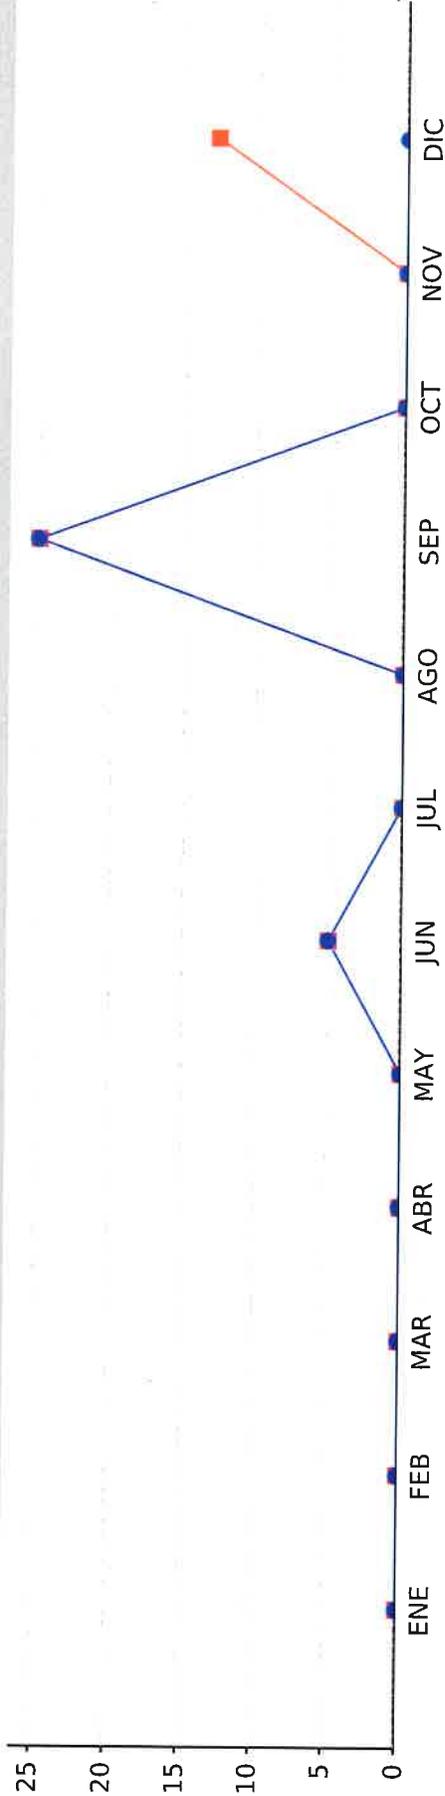

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 309. PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN AC-171 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1134. PORCENTAJE DE PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN EN PROCESO DE EJECUCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	COPP	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN	25.00	PROYECTO
CONSTANTE	CRHP	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO	118.00	PROYECTO


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	14.41
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	21.19	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
 TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN
 PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)
 DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

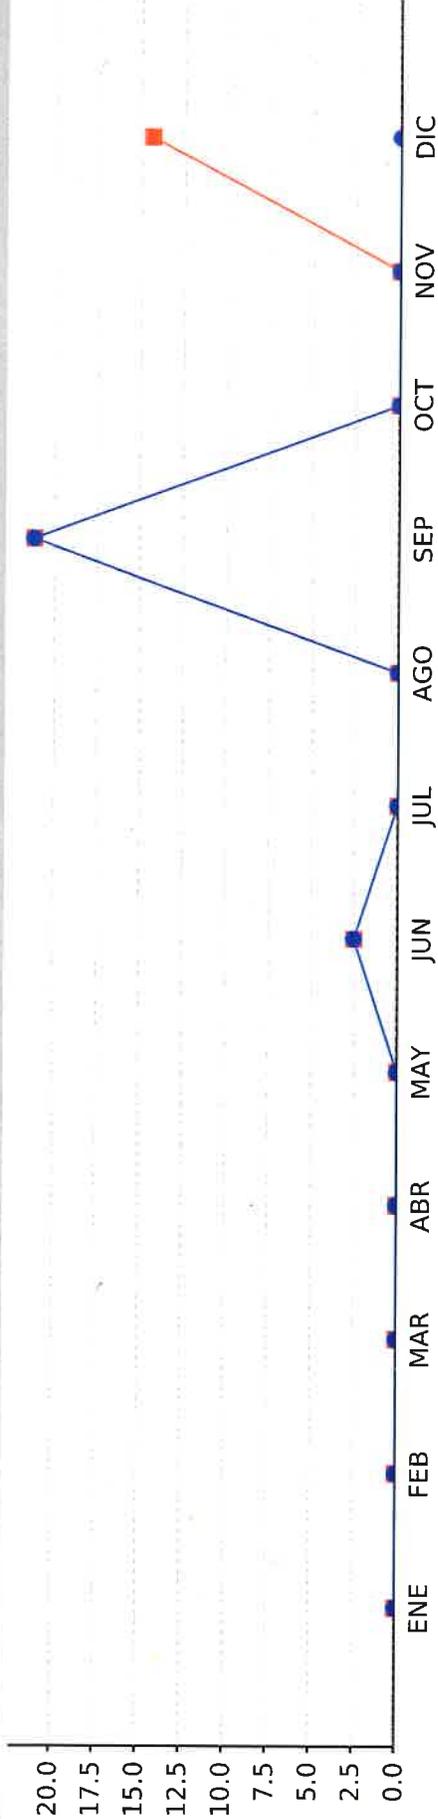

PROGRAMADO (■) ALCANZADO (●)

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACION	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
EULALIO MAYA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 248. PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO AC-170 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1158. PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO REALIZADOS A PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO/TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PERM	NÚMERO DE PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	31.00	PROYECTO
CONSTANTE	TPEM	TOTAL DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	97.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	31.96	0.00	0.00	7.22
EVALUADO	0.00	0.00	1.03	0.00	0.00	13.40	0.00	0.00	31.96	0.00	0.00	0.00


FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

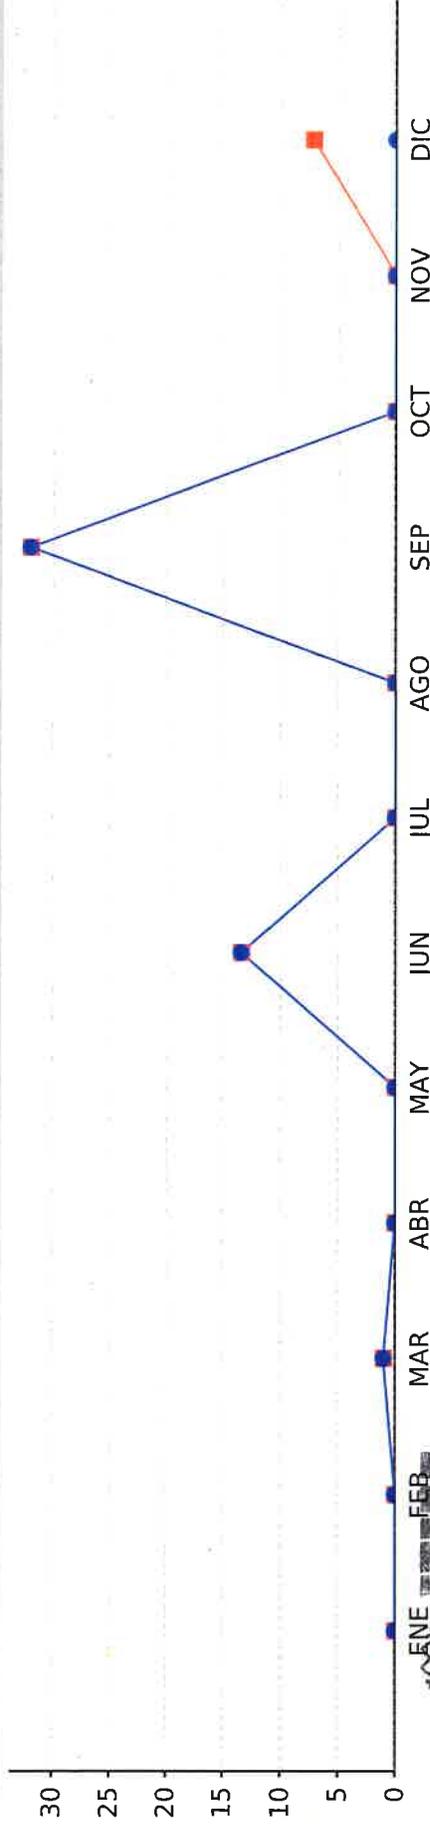

PROGRAMADO (Red square) / ALCANZADO (Blue circle)

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ EULALIO NAVÁ BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL	AUTORIZÓ MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL
---	---	---

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** ESTRATÉGICO
PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA
OBJETIVO: 308. CONTRATOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO
INDICADOR: 1148. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO / TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CCRM	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	28.00	CONTRATO
CONSTANTE	TCME	TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	100.00	CONTRATO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	16.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: ESTRATÉGICO

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

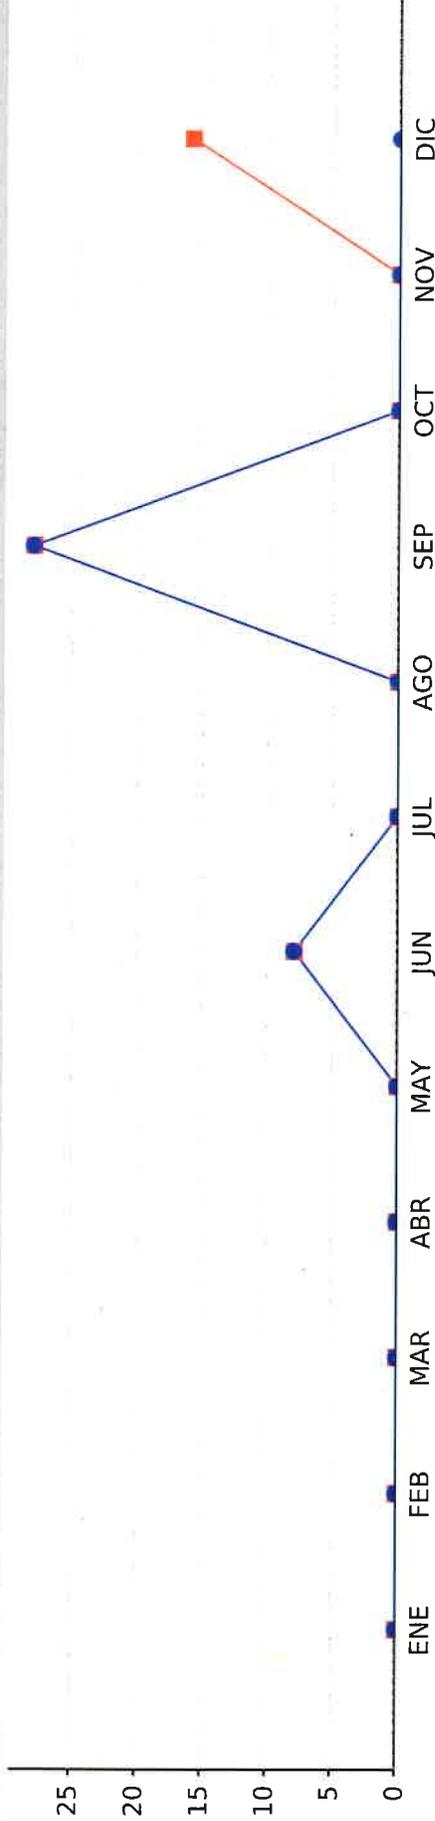

PROGRAMADO (Red Square) **ALCANZADO** (Blue Circle)

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNA NUEVA HISTORIA
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZO
EULALIO KAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 311. PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN AC-170 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1118. PORCENTAJE DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PROCESO DE EJECUCIÓN **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RHMP	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO	28.00	PROYECTO
CONSTANTE	CRHP	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO	118.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	23.73	0.00	0.00	15.25
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.08	0.00	0.00	23.73	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

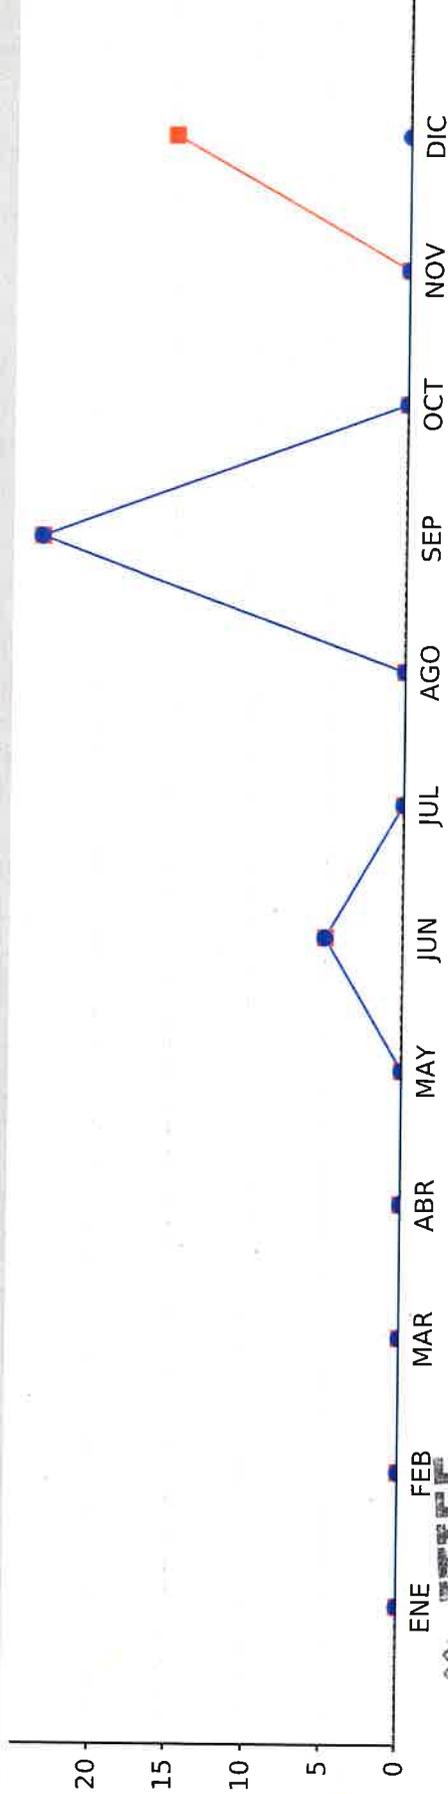

PROGRAMADO (■) ALCANZADO (●)

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 316. CONTRATOS DE EQUIPAMIENTO CONCRETADOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1160. PORCENTAJE DE CONTRATOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO CONCRETADOS **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO/TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	CCEQ	NÚMERO DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE EQUIPAMIENTO	1.00	CONTRATO
CONSTANTE	TCME	TOTAL DE CONTRATOS REALIZADOS EN LA CATEGORÍA DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	100.00	CONTRATO


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	4.00
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

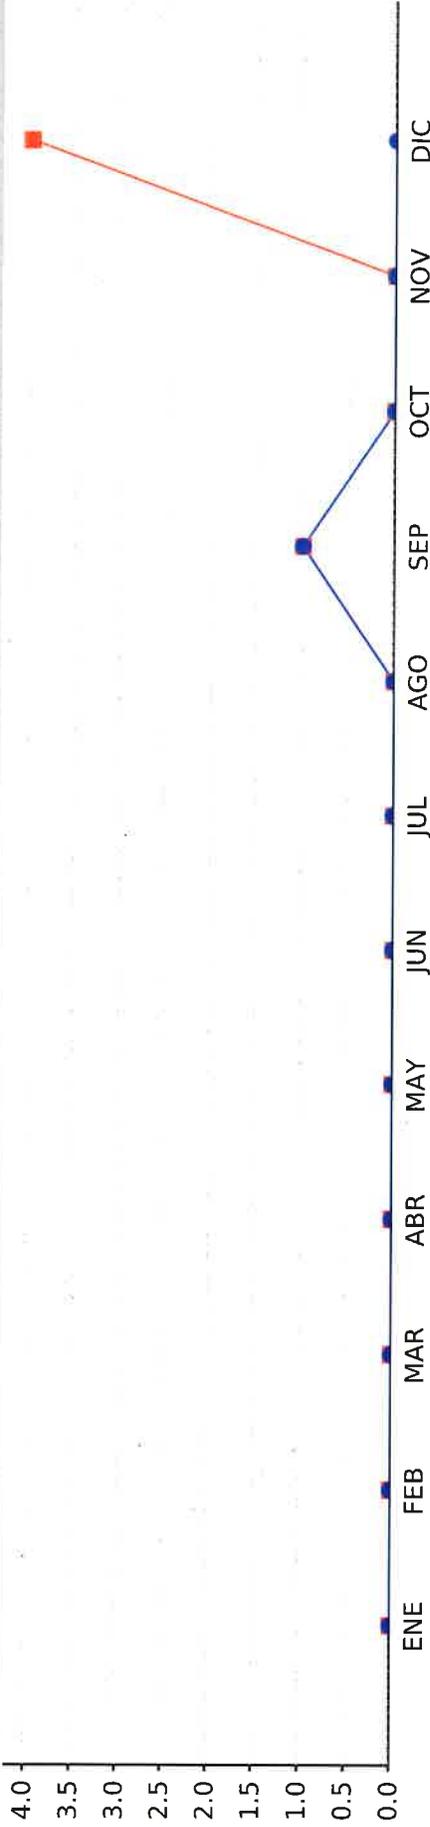

PROGRAMADO ● ALCANZADO ■

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRACIÓN	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 320. PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE RECEPCIÓN DE EQUIPAMIENTO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1113. PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS DE MOBILIARIO Y EQUIPO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO/TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MOPP	NÚMERO DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	3.00	PLANTEL
CONSTANTE	CRHP	TOTAL DE PLANTELES EDUCATIVOS CON PROYECTOS EN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN / MANTENIMIENTO Y MOBILIARIO O EQUIPO	118.00	PROYECTO

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	15.25
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.54	0.00	0.00	0.00


FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

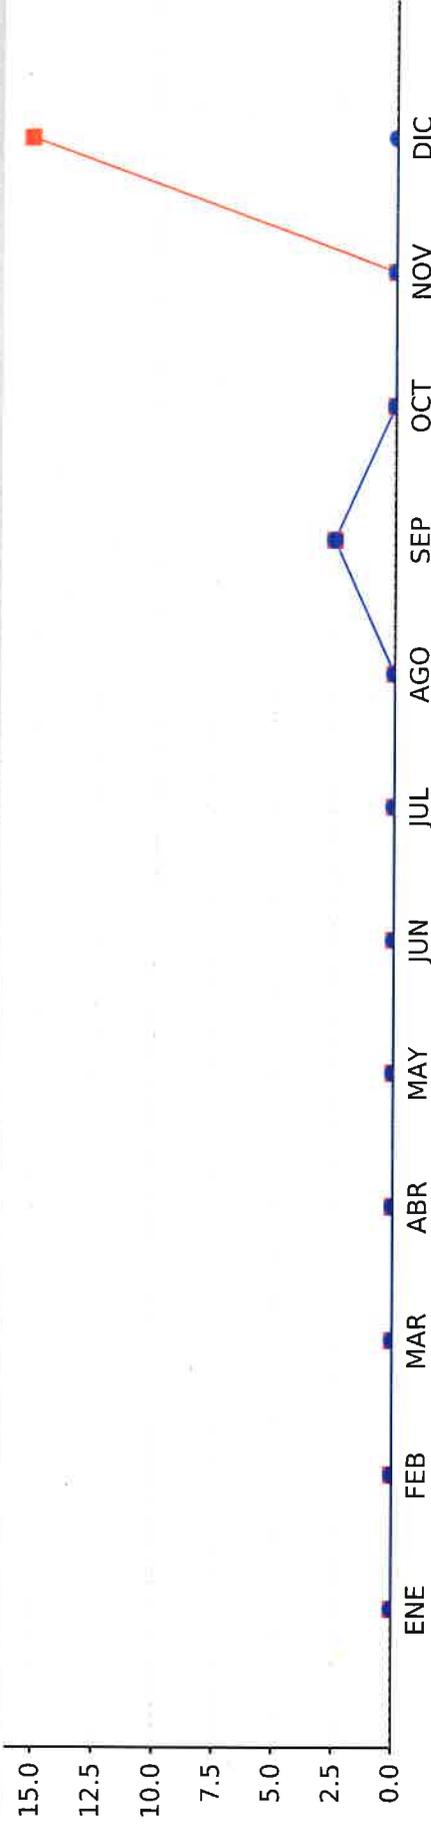

<p>ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>PROGRAMADO ■ ALCANZADO ●</p> <p>ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL</p>	<p>ITIFE INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DIRECCIÓN GENERAL</p>
<p>RESPONSABLE DEL PROYECTO</p> <p>MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL</p>	<p>AUTORIZÓ</p> <p>MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL</p>	<p>JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p> <p>EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN</p>

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 323. ESTUDIANTES HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1107. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES HOMBRES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADOS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025/TOTAL DE HOMBRES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	HEBF	HOMBRES ESTUDIANTES BENEFICIADOS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	225.00	HOMBRE
CONSTANTE	THET	TOTAL DE HOMBRES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA	124,770.00	HOMBRE

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	6.93
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025)

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

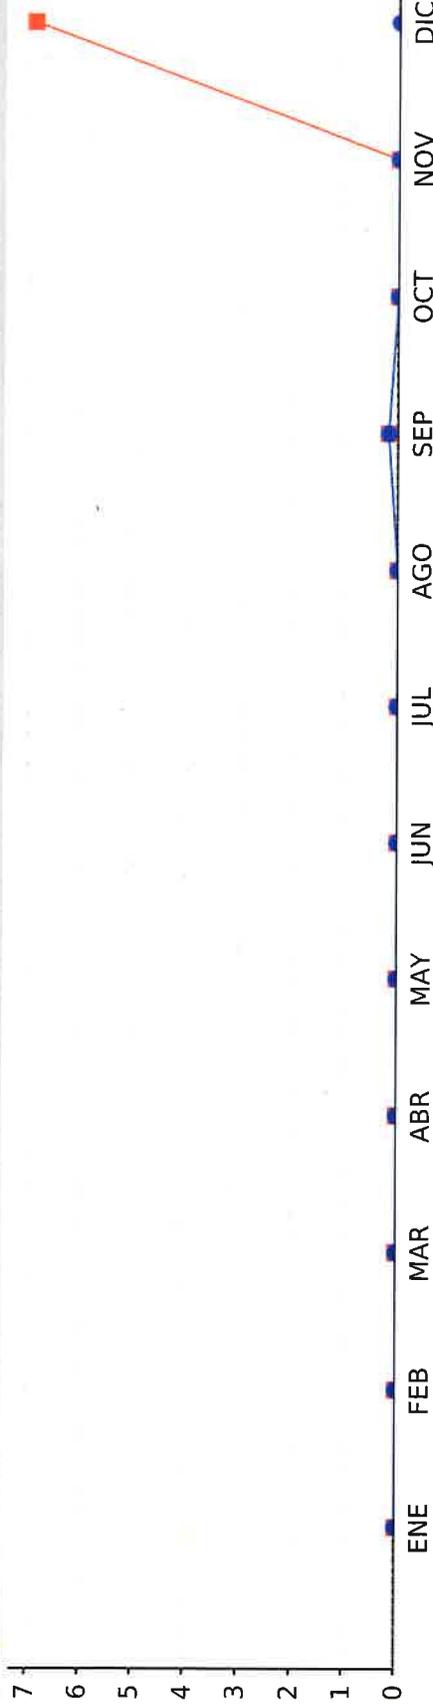

PROGRAMADO ● ALCANZADO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO ADMINISTRACIÓN

EULALIO NAVA BRIONES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

RESPONSABLE DEL PROYECTO

MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

AUTORIZÓ

MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ
DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 324. ESTUDIANTES MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE PORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025 **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** OTRO PERIODO

INDICADOR: 1098. ESTUDIANTES MUJERES DE NIVEL BÁSICO BENEFICIADAS CON ENTORNOS FAVORABLES DE ENSEÑANZA DERIVADO DEL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025 **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025/TOTAL DE MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	MEBF	MUJERES ESTUDIANTES BENEFICIADAS CON EL FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025	220.00	MUJER
CONSTANTE	TMET	TOTAL DE MUJERES ESTUDIANTES DE NIVEL BÁSICO DEL ESTADO DE TLAXCALA	122,363.00	MUJER


	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	6.79
EVALUADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 3 / 03. TRANSFORMANDO LA EDUCACIÓN CON INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE CALIDAD (FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES BÁSICO 2025) DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

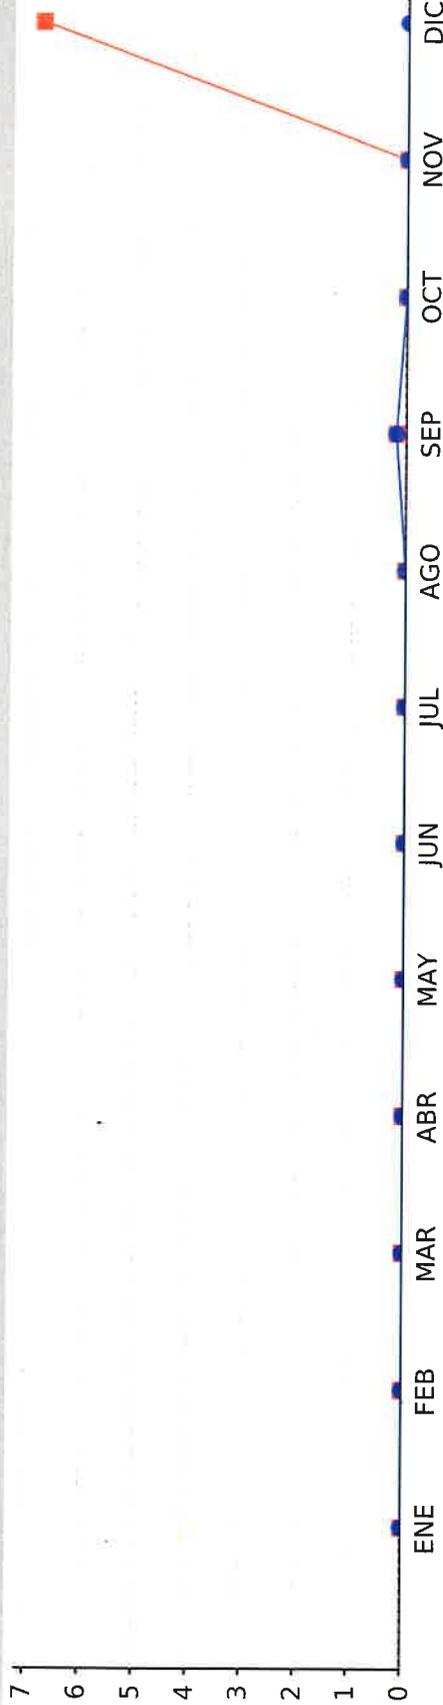

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN

PROGRAMADO - ALCANZADO
ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCION GENERAL

RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA



CLASIFICACIÓN Pp: E. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
UNIDAD RESPONSABLE: 2. DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
PROYECTO: 4 - 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE

NV	OBJ	NOMBRE	U.M.	ANUAL	SEPTIEMBRE PROGRAMADO	SEPTIEMBRE ALCANZADO	SEPTIEMBRE ACUMULADO	OBSERVACIONES
F		PORCENTAJE DEL AVANCE EN LA IMPLANTACIÓN Y OPERACIÓN DEL IPBR-SED	PORCENTAJE	65.30	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL
P		PORCENTAJE DEL GASTO EJECUTADO CON RELACIÓN AL PRESUPUESTO AUTORIZADO Y SUS MODIFICACIONES	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL
C	1	PORCENTAJE DE INDICADORES CON CUMPLIMIENTO ADECUADO CON RESPECTO DEL TOTAL DE INDICADORES ESTABLECIDOS EN LOS PROYECTOS	PORCENTAJE	100.00	0.00	0.00	0.00	INDICADOR ANUAL
A	1.1	PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO	PORCENTAJE	100.00	100.00	100.00	75.00	SE CUENTAN CON LAS 34 PLAZAS OCUPADAS DEL PERSONAL DE CONFIANZA
	1.2	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO	PORCENTAJE	100.00	16.33	9.27	32.04	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE EJERCEN RECURSOS MENORES A LOS PROGRAMADOS FALTA EJERCER MÁS RECURSOS DE LOS FONDOS FAM 2025.
	1.3	PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN	PORCENTAJE	100.00	9.52	9.52	71.40	SE PRESENTAN VEINTE REQUISICIONES PARA PAGO EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2025 Y SE REALIZA EL PAGO DE LAS PROGRAMADAS PARA ALCANZAR EL CIENTO POR CIENTOS DE REQUISICIONES AUTORIZADAS

ELABORÓ

[Signature]

LICENCIADO EULALIO NAVA BRIONES

JEFE DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

[Signature]

ARQUITECTO MÁTEO SERGIO SÁNCHEZ RAMÍREZ

DIRECTOR GENERAL



INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** EFICACIA

OBJETIVO: 238. LOGRO EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL

INDICADOR: 1428. PORCENTAJE DE PERMANENCIA DE PERSONAL CON RESPECTO AL DEL COMIENZO DEL EJERCICIO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES/TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO)*100

ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	NPOM	NÚMERO DE PLAZAS OCUPADAS EN EL MES	34.00	PLAZA
CONSTANTE	TPAM	TOTAL DE PLAZAS AUTORIZADAS EN EL DECRETO	34.00	PLAZA

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
EVALUADO	0.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA


DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR

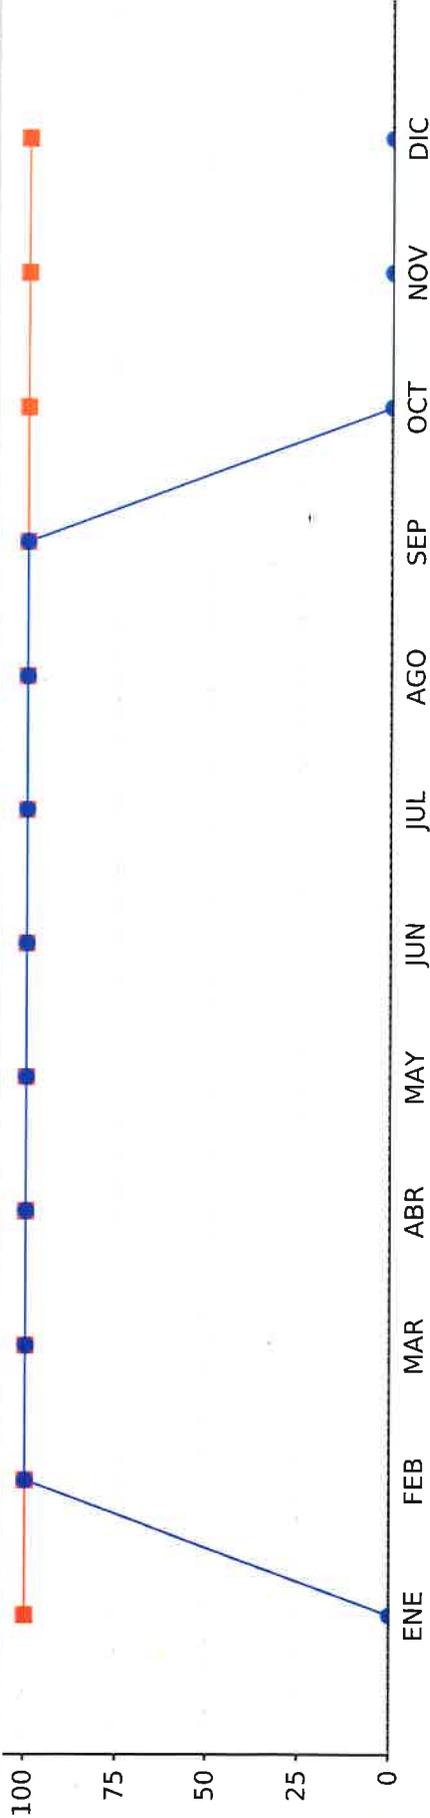

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN ELABORÓ

PROGRAMADO - ALCANZADO
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN DEL PROYECTO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
DIRECCIÓN GENERAL

ELABORÓ	RESPONSABLE DEL PROYECTO	AUTORIZÓ
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA **TIPO DE INDICADOR:** DE GESTIÓN

PROYECTO: 4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE **DIMENSIÓN QUE ATIENDE:** ECONOMÍA

OBJETIVO: 239. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **FRECUENCIA DEL INDICADOR:** MENSUAL

INDICADOR: 1421. PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO **UNIDAD DE MEDIDA:** PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES/PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO)*100


ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	PEM	PRESUPUESTO EJERCIDO EN EL MES	36,276,922.00	PESOS
CONSTANTE	PAEE	PRESUPUESTO ASIGNADO EN EL EJERCICIO	391,541,668.00	PESOS

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	0.30	0.30	0.28	0.24	0.23	0.21	0.23	16.33	16.36	16.33	16.35	32.84
EVALUADO	0.00	0.30	1.65	1.76	0.14	11.33	6.98	0.35	9.27	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA	
DEPENDENCIA:	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROYECTO:	4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	ECONOMÍA

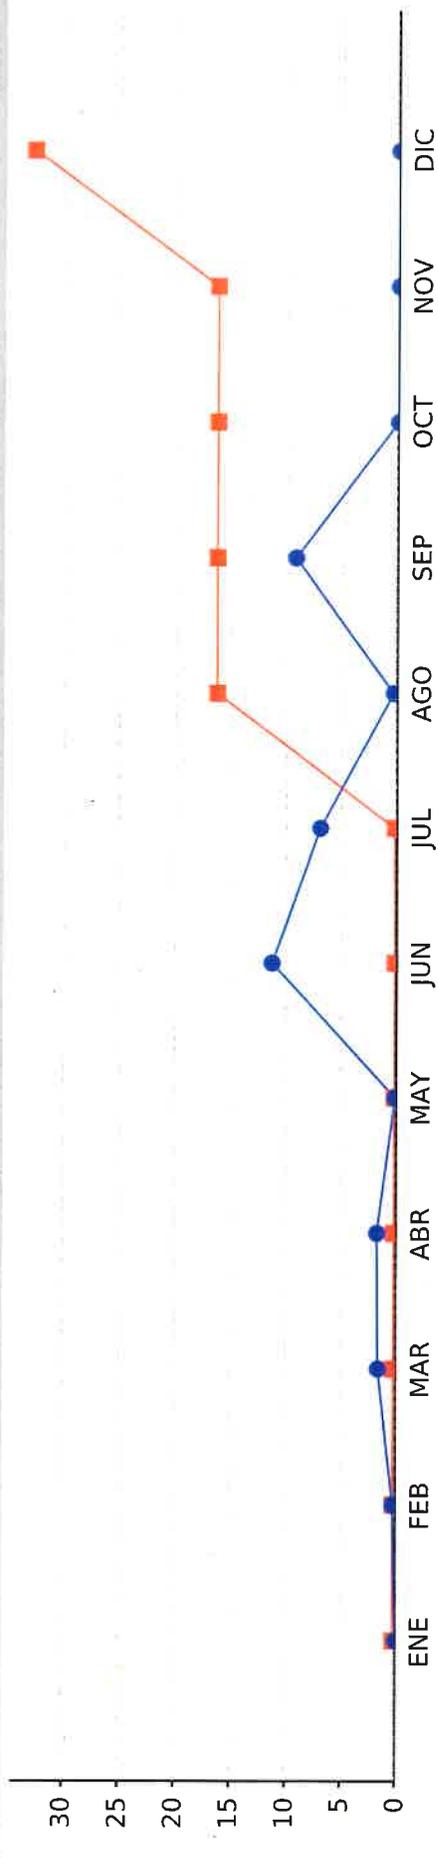

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

PROGRAMADO (Red Square) **ALCANZADO** (Blue Circle)

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ADMINISTRACION	RESPONSABLE DEL AVANCE	AUTORIZO
EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	EULALIO NAVA BRIONES JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN	MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA

DEPENDENCIA: 40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

TIPO DE INDICADOR: DE GESTIÓN

PROYECTO: 4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE

DIMENSIÓN QUE ATIENDE: EFICACIA

OBJETIVO: 240. GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES

FRECUENCIA DEL INDICADOR: MENSUAL

INDICADOR: 1397. PORCENTAJE DE REQUISICIONES AUTORIZADAS O APROBADAS PARA SU EJECUCIÓN

UNIDAD DE MEDIDA: PORCENTAJE

MÉTODO DE CÁLCULO

(REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES/TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS)*100


ESTRUCTURA DEL INDICADOR

TIPO	ELEMENTO	DESCRIPCIÓN	VALOR	UNIDAD DE MEDIDA
VARIABLE	RARM	REQUISICIONES AUTORIZADAS POR RECURSOS MATERIALES	20.00	REQUISICIÓN
CONSTANTE	TRAM	TOTAL DE REQUISICIONES SOLICITADAS	210.00	REQUISICIÓN

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
PROGRAMADO	4.76	9.52	9.52	4.76	9.52	9.52	4.76	9.52	9.52	4.76	9.52	14.32
EVALUADO	0.00	9.52	9.52	4.76	9.52	9.52	4.76	9.52	9.52	0.00	0.00	0.00

FICHA DE AVANCE DE INDICADOR

ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y PROGRAMÁTICA	
DEPENDENCIA:	40. INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA
PROYECTO:	4 / 04. CONTROL ADMINISTRATIVO ITIFE
COMPORTAMIENTO DEL INDICADOR	
TIPO DE INDICADOR:	DE GESTIÓN
DIMENSIÓN QUE ATIENDE:	EFICACIA

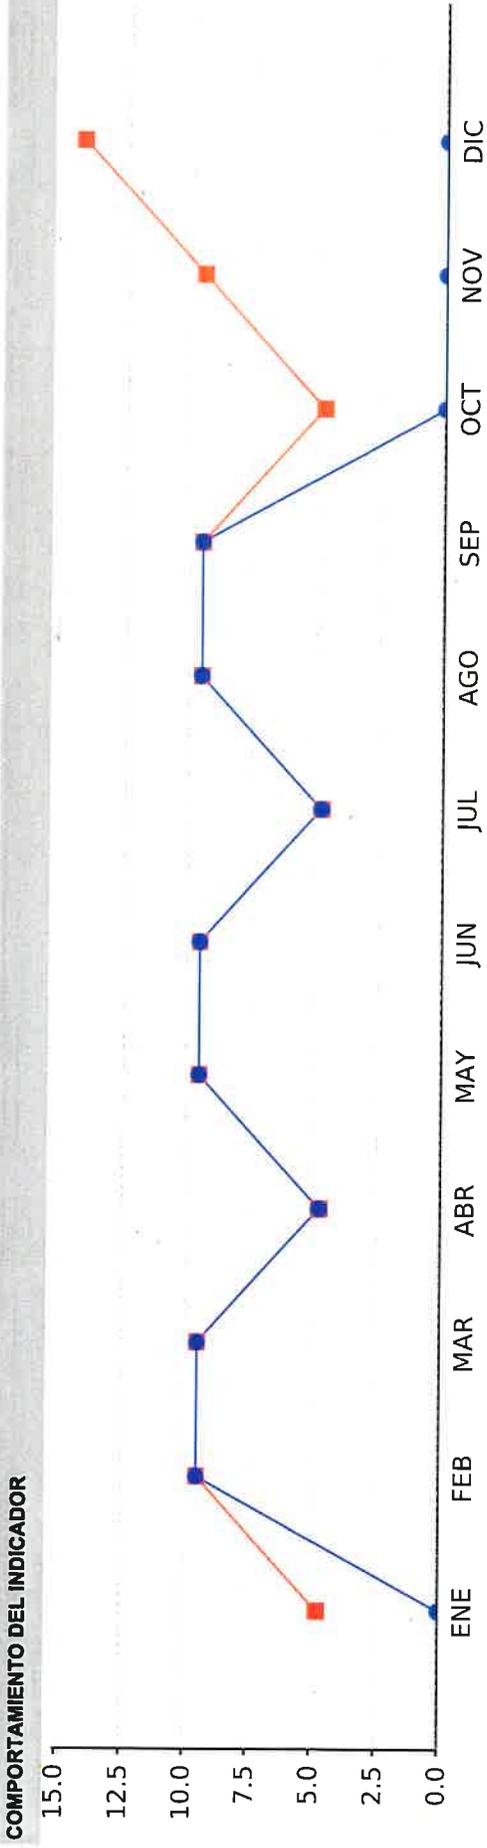

PROGRAMADO - ALCANZADO

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

ITIFE
INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

DIRECCIÓN GENERAL

DEPARTAMENTO ELABORÓ ADMINISTRACIÓN EULALIO NAVA BRIONES	DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EULALIO NAVA BRIONES	AUTORIZO MATEO SERGIO SANCHEZ RAMIREZ DIRECTOR GENERAL
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN EULALIO NAVA BRIONES	RESPONSABLE DEL PROYECTO ADMINISTRACIÓN EULALIO NAVA BRIONES	JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN
